

# Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2025-2028 (WPRiM)

## Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Miasta i Gminy Kórnik

### Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik

Dział Techniczny

20.03.2025 r.

## Plan prezentacji

1. Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych.
2. Zadania zakończone w 2023 i 2024 r.
3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych.
4. Zadania w trakcie projektowania.
5. Informacja o planowanym zleceniu koncepcji.
6. Nakłady poniesione na inwestycje w Gminie Kórnik w latach 2015-2024.

## 1. Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych

Etap zadania	Ilość zadań
Zadania zakończone w 2023 i 2024	5
Zadania w trakcie robót budowlano - montażowych	14
Zadanie w trakcie projektowania	21
Zadania dla których planowane jest opracowanie koncepcji	2

## 2. Zadania zakończone w 2023 i 2024 r.

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadania	Łączne nakłady [zł]	Podpisane umowy	Podłączenia	Efekt podłączeń
1	3-11-19-243-1	Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Bułankowej w Kamionkach	98 027	2	2	100%
2	3-11-19-244-1	Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Poranek w Koninku	363 570	3	3	100%
3	5-11-19-304-1	Kórnik - przyłącza kanalizacyjne w ul. Leśny Zakątek 4-30 i ul. Na Skraju Lasu 21-31 w Kamionkach	126 545	20	18	90%
4	3-11-17-184-1	Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Miętowej w Skrzynkach	487 643	9	9	100%
5	3-11-06-011-1	Kórnik - magistrala wodociągowa	75 376 714			

### 3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych

## Zadanie inwestycyjne 3-11-14-251-1


Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. Skowronkowej i Wesolej w Szczytnikach, ul. Jaśminowej w Kamionkach i ul. Drapałka w Borówcu




ul. Skowronkowa w Szczytnikach



ul. Wesola w Szczytnikach

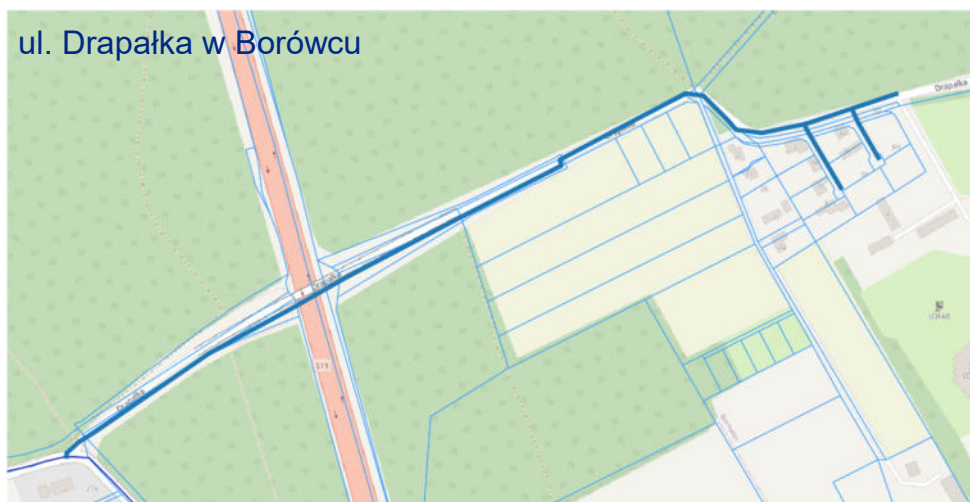

ul. Drapałka w Borówcu

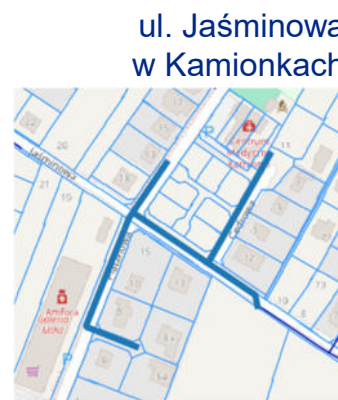

ul. Jaśminowa  
w Kamionkach

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej

- DN 150mm, dł. 1915m

- DN 100mm, dł. 2860m

- DN 50mm, dł. 700m

wraz z przyłączami


Łączne nakłady: 9 363 253 zł.

Grupa II.

2025 - 2028 - roboty budowlano-  
montażowe

Planowane przekazanie do Działu  
Przetargów II - III kwartał 2025

## Zadanie inwestycyjne 3-11-17-024-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Cisowej w Błażejewku

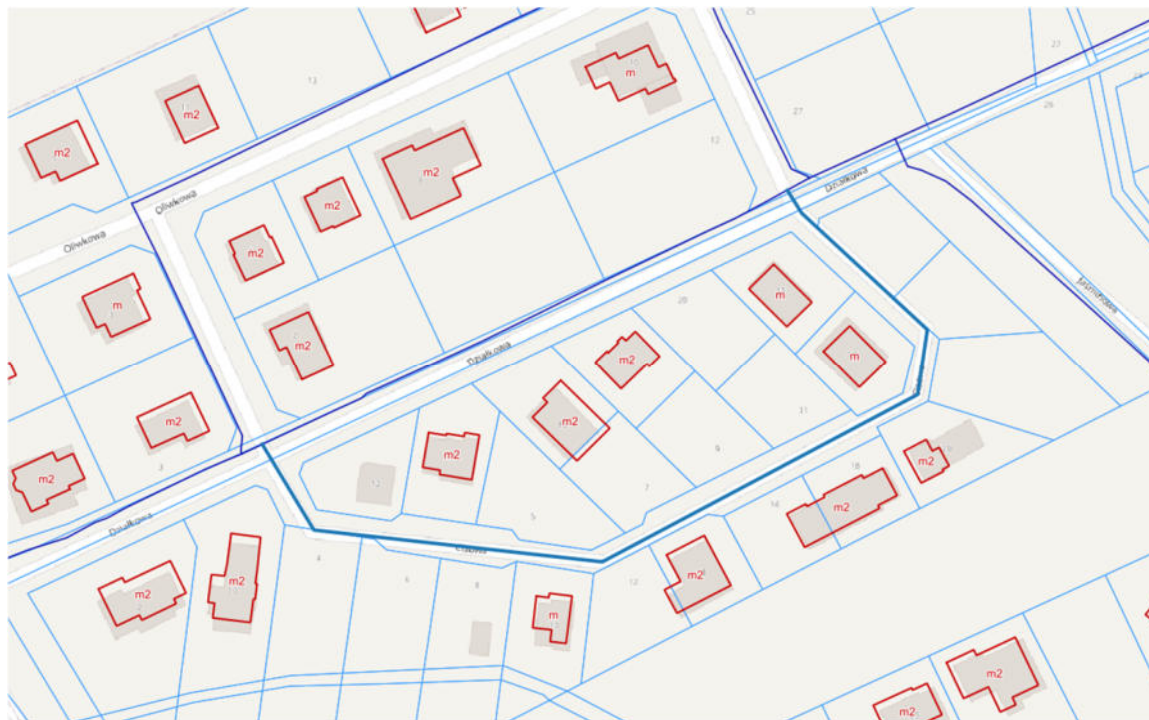

Zakres:  
Budowa sieci wodociągowej  
DN 100mm, dł. 230m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 902 596 zł.

Grupa II.


2025-2026 - roboty budowlano – montażowe  
Umowa z Wykonawcą podpisana w 02.2025.

Wspólna realizacja z zadaniem:  
3-11-15-081-1 Kórnik – sieć wodociągowa  
w ul. Kasztanowej w Błażejewku.



Zadanie inwestycyjne 3-11-15-081-1

Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej w Błazejewku.

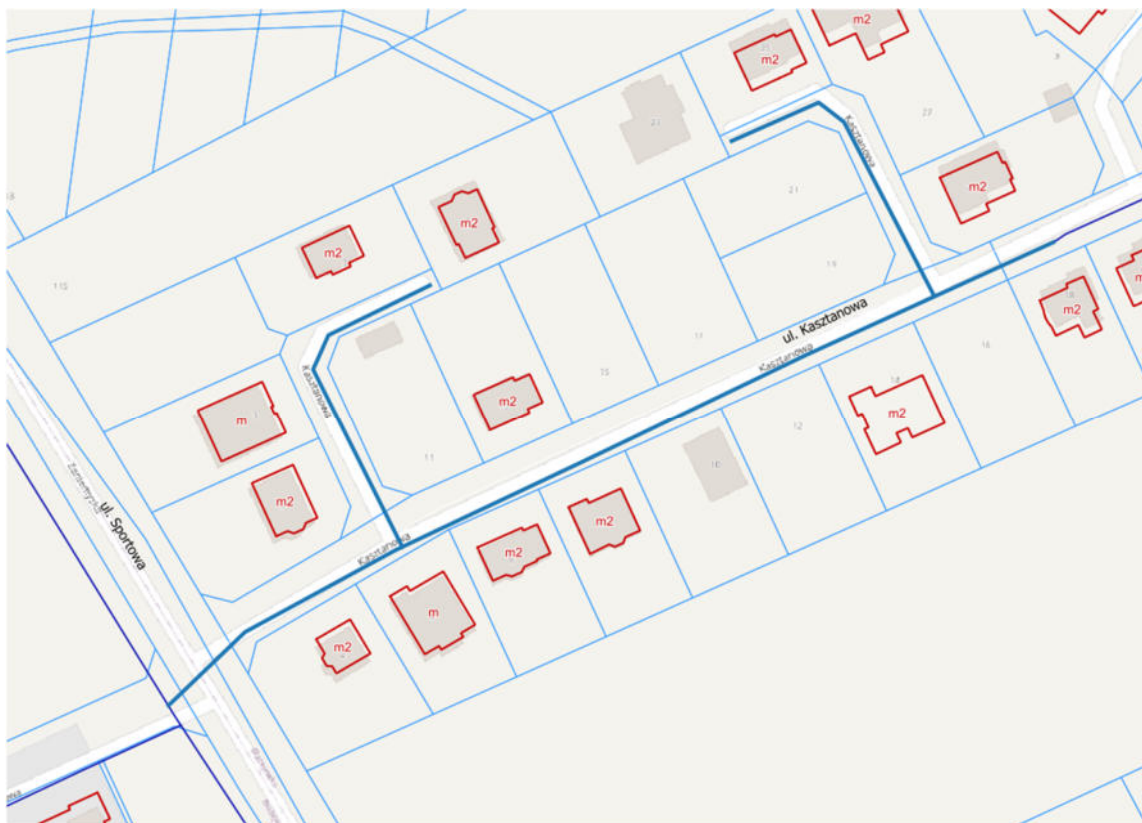

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:  
DN 100mm, dł. 375m wraz z przyłączami.


Łączne nakłady: 1 063 115 zł.

Grupa II.

2025-2026 - roboty budowlano – montażowe  
Umowa z Wykonawcą podpisana w 02.2025.

Wspólna realizacja z zadaniem:  
3-11-17-024-1 Kórnik - sieć wodociągowa  
w ul. Cisowej w Błazejewku

## Zadanie inwestycyjne 3-11-16-145-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Zielonej w Borówcu.

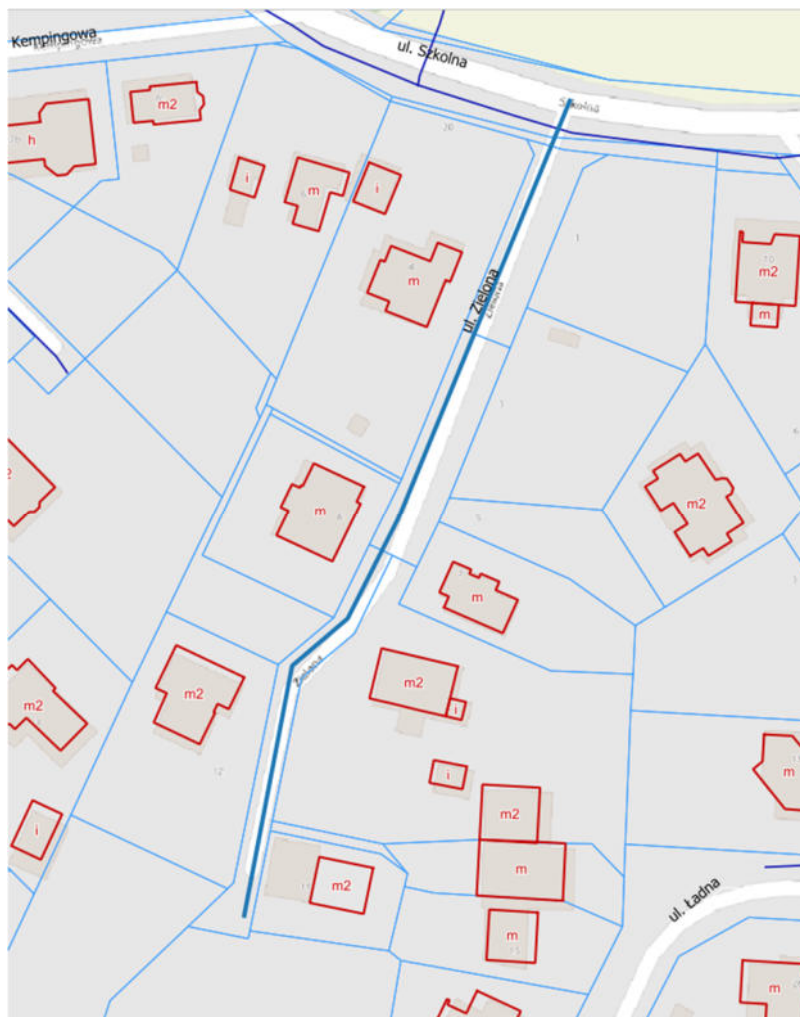

Zakres:  
Budowa sieci wodociągowej:  
DN 100mm, dł. 180m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 344 961 zł.

Grupa II.


2024 - 2027 - roboty budowlano – montażowe  
(w trakcie).

Wspólna realizacja z zadaniami:  
5-11-14-130-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna  
dla m. Skrzynki - Etap I  
5-11-14-147-1 Kórnik – rurociąg tłoczny  
z przepompowni głównej w Kórniku  
do oczyszczalni ścieków w Borówcu  
3-11-19-263-0 Kórnik - sieć wodociągowa  
w ul. Wiśniowej, Leśnej i Szkolnej w Skrzynkach

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-130-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Skrzyńki - Etap I

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-147-1 Kórnik – rurociąg tłoczny z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-263-0 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Wiśniowej, Leśnej i Szkolnej w Skrzyńkach

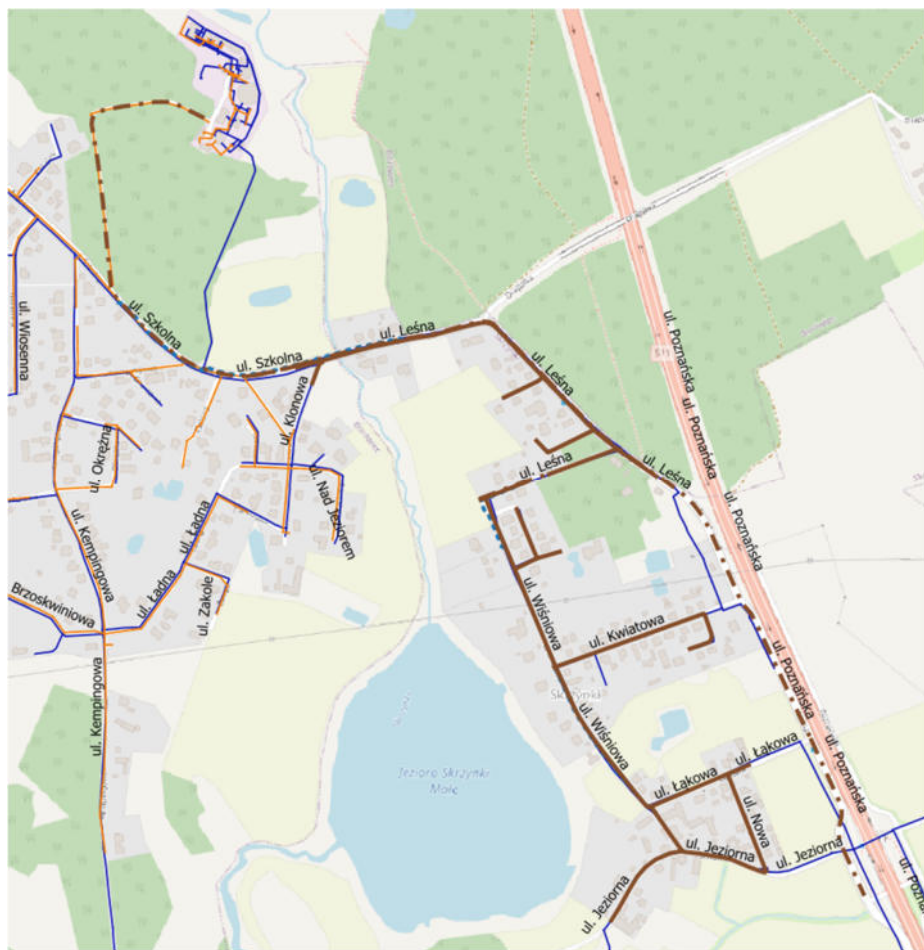

Zakres:

(14-130) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 250mm dł. ok. 3 010m, DN 200mm dł. 184m, przepompowni ścieków - 3 szt., budowa rurociągu tł. DN 90, 110mm i dł. 300m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 13 194 558 zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

(14-147) Budowa rurociągu tłoczego DN 300mm, dł. ok. 3700m.

Wyłączenie z eksploatacji ist. rurociągów tłocznych 2xDN 300mm o łącznej dł. ok. 6700m.

Przebudowa przepompowni wraz z zapleczem techn.

Łączne nakłady: 19 077 381 zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

(19-263) Przeniesienie wodociągu z działek prywatnych:

ul. Wiśniowa DN 100mm, dł. 77+63m

ul. Leśna/Wiśniowa DN 100mm, dł. 160m

ul. Szkolna DN 100mm, dł. 218 m


wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 213 841 zł.

Grupa II.

2024-2027- roboty budowlano – montażowe (w trakcie)

Zadanie inwestycyjne 3-11-18-054-1  
Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

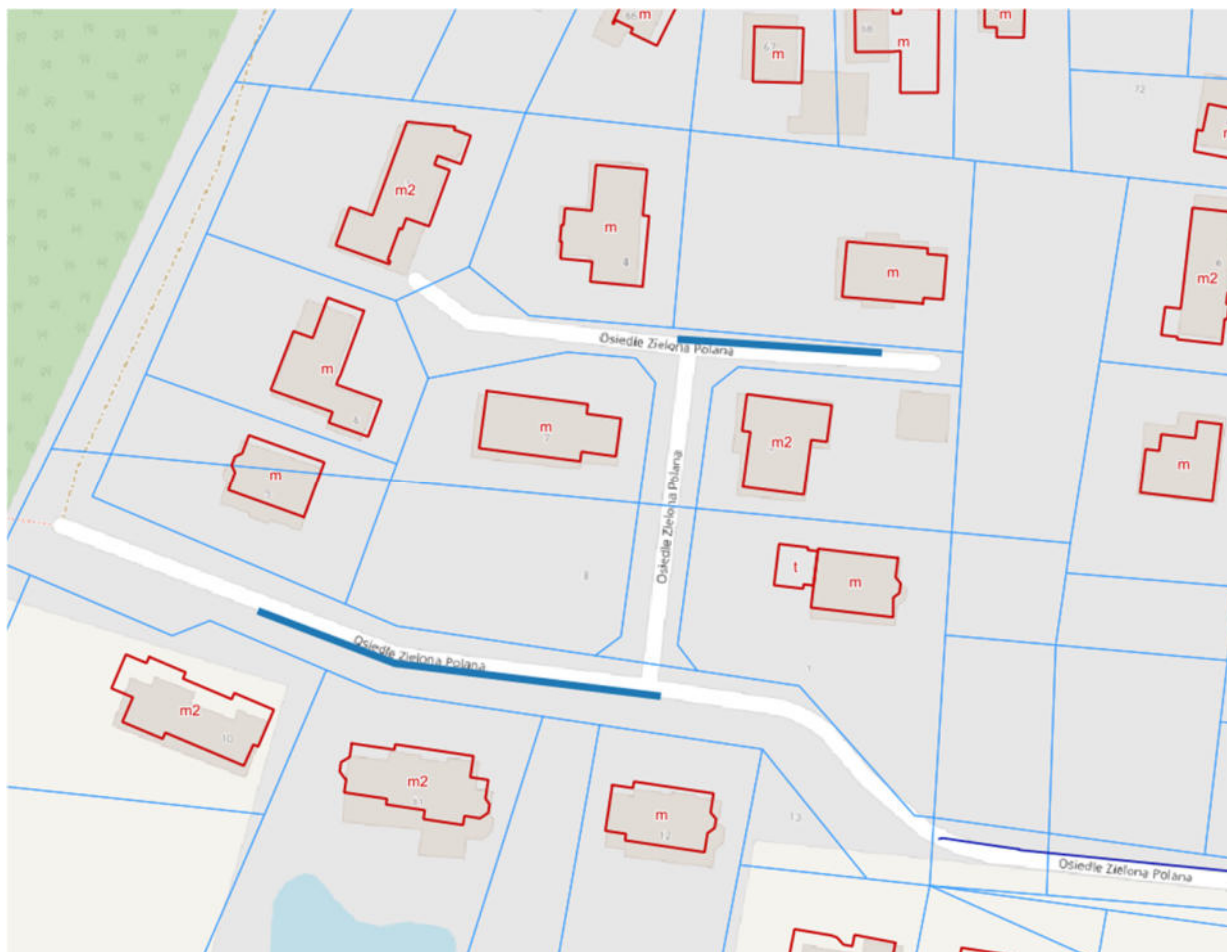

Zakres:  
Budowa sieci wodociągowej  
DN 100mm, dł. 135m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 451 576 zł.

Grupa II.


2025 - 2026 - roboty budowlano-  
montażowe

Planowane przekazanie do Działu  
Przetargów II kwartał 2025.

Zadanie powiązane z zad.:  
5-11-19-257-1 - Kórnik - kanalizacja  
sanitarna w ul. Os. Zielona Polana  
w Borówcu

## Zadanie inwestycyjne 5-11-19-257-1

Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

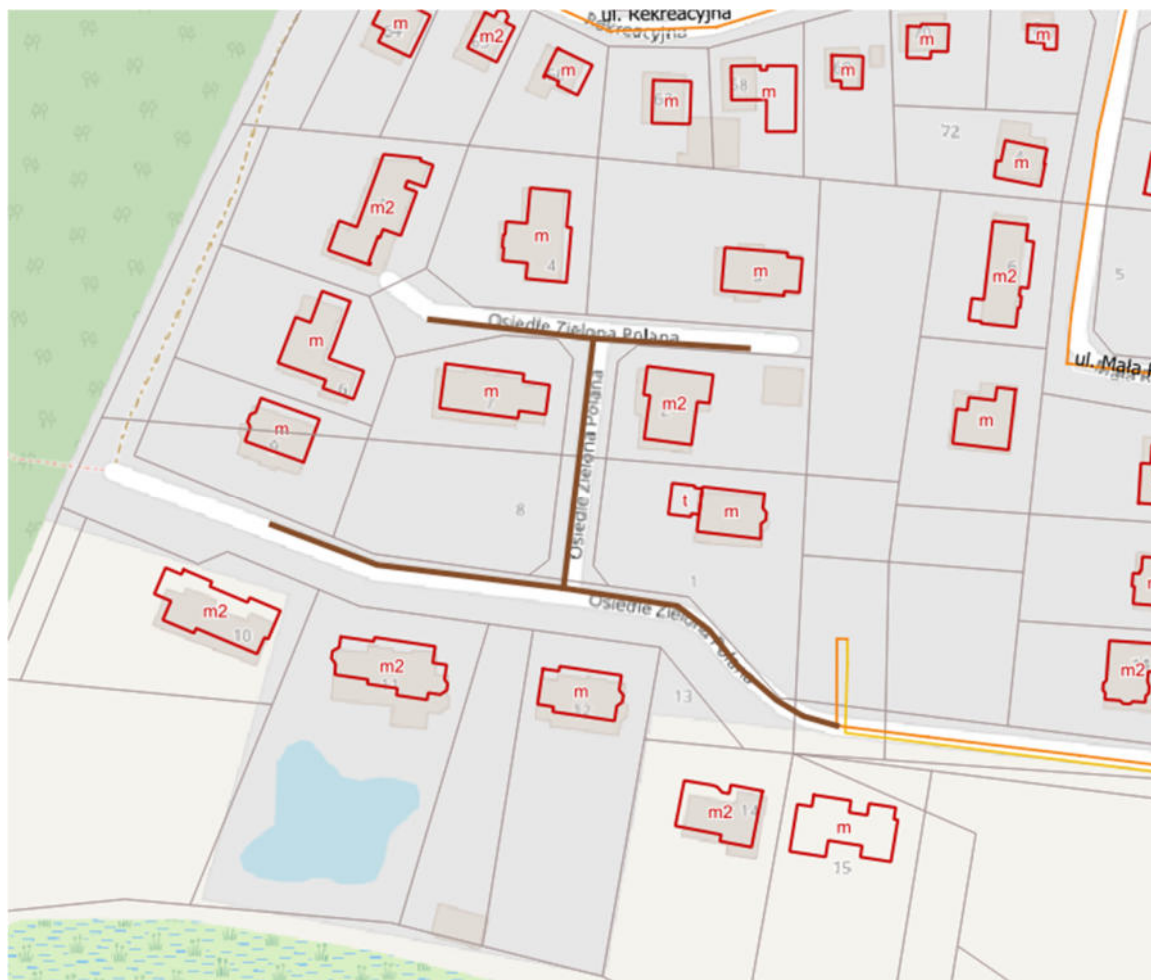

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej

- DN 250mm, dł. 70m,

- DN 200 m, dł. 230m,

wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 247 323 zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.


2025 - 2026 - roboty budowlano-  
montażowePlanowane przekazanie do Działu  
Przetargów II kwartał 2025

Zadanie powiązane z zad.:

3-11-18-054-1 - Kórnik - sieć  
wodociągowa w ul. Os. Zielona Polana  
w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-340-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Ładnej w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 5-11-19-341-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Ładnej w Borówcu

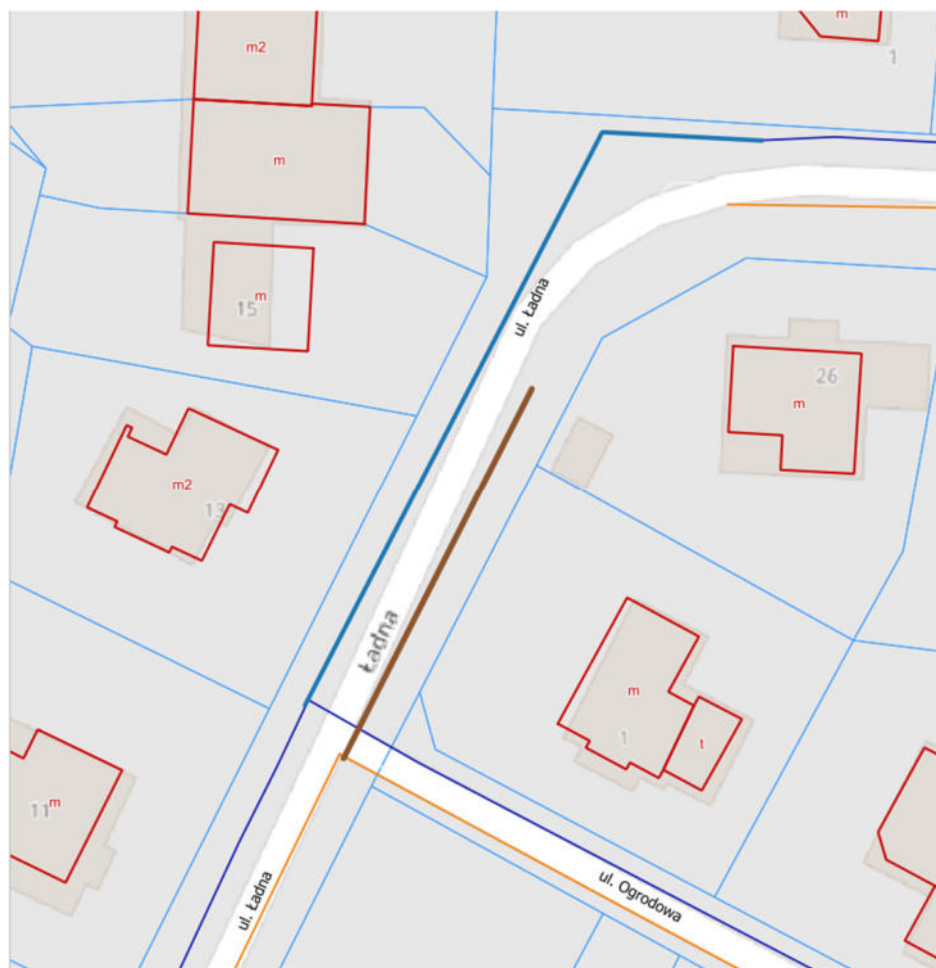

Zakres:

(19-340) Budowa sieci wodociągowej DN 100mm, dł. 75m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 95 035 zł.

(19-341) Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. 40m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 149 160 zł.


Grupa II.

2025 - roboty budowlano – montażowe.

Umowa z Wykonawcą podpisana w 02.2025.

## Zadanie inwestycyjne 5-11-14-096-1

### Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Widokowej w Borówcu

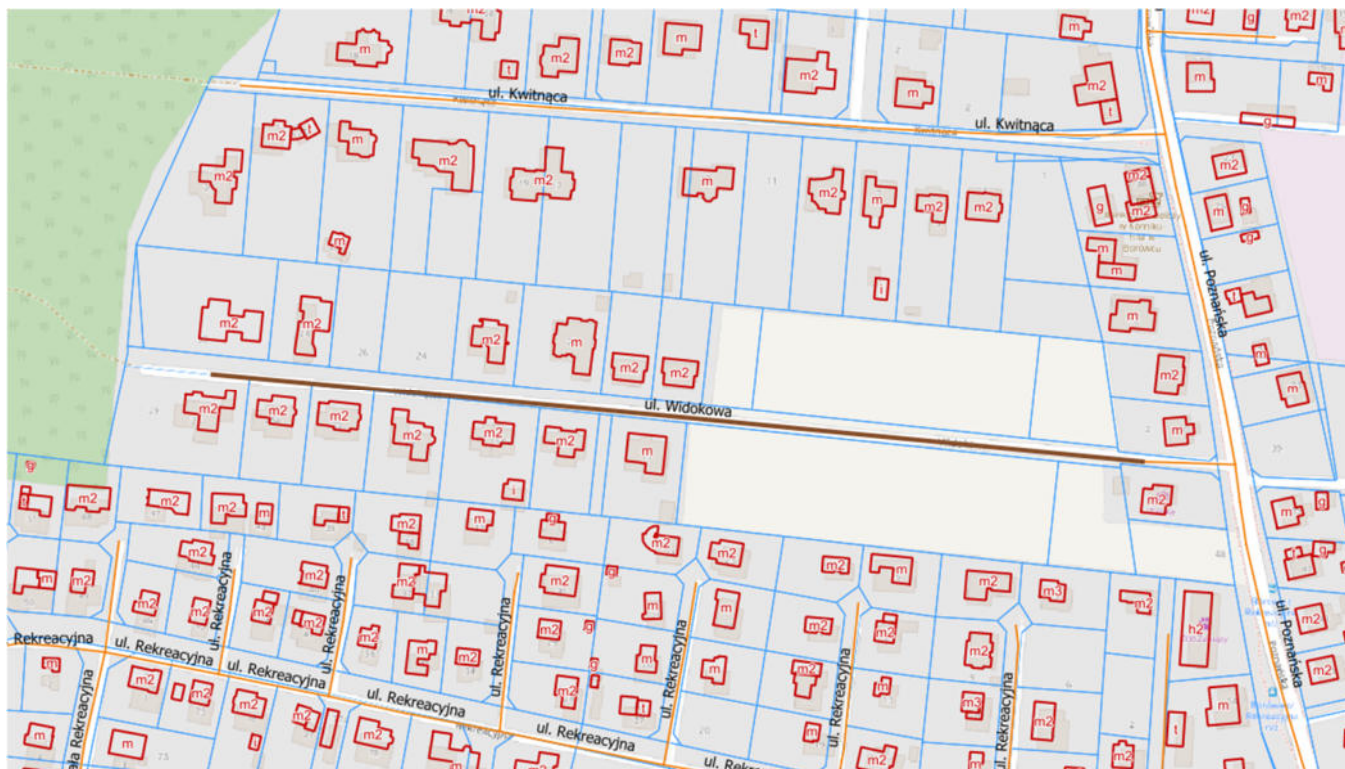

Zakres:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300mm, dł. ok. 360 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 160 584 zł.


Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2025 - roboty budowlano – montażowe.

W trakcie podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zadanie inwestycyjne 5-11-13-174-1

Kórnik - kanalizacja sanitarne w rejonie ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dzieńmierowie

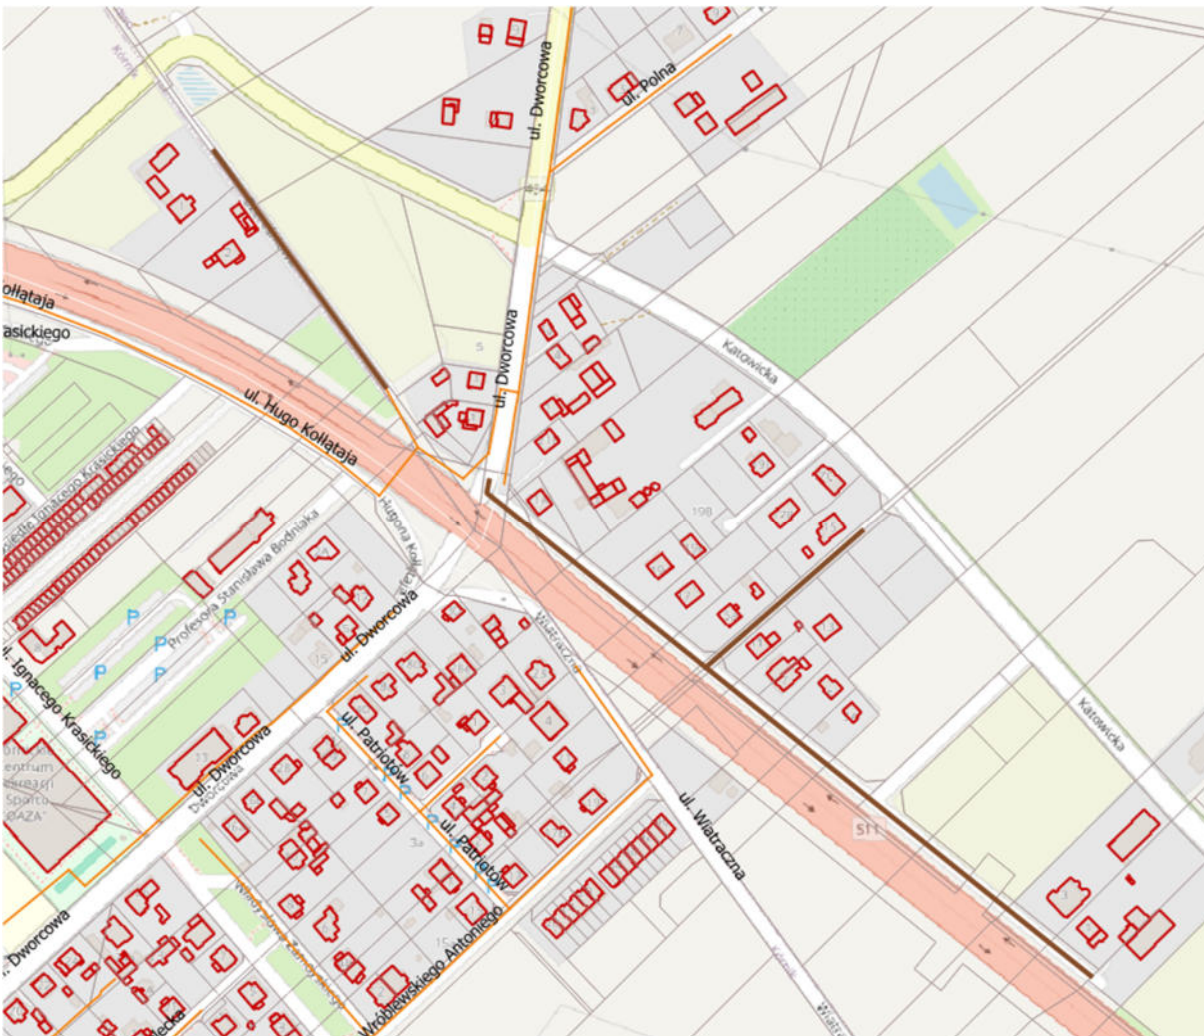

Zakres w ul. Czereśniowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Czereśniowej:  
DN 200mm, dł. 173m wraz z przyłączami.

2025-2026 - roboty budowlano-  
montażowe  
Postępowanie unieważnione ze względu  
na przekroczenie budżetu. Planowane  
ogłoszenie nowego postępowania  
II – III kwartał 2025.

Łączne nakłady na całe zadanie:  
2 862 908 zł.

Grupa II.

Inwestor zastępczy – Gmina Kórnik.



## Zadanie inwestycyjne 5-11-14-129-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Biernatki



Zakres:

Budowa

- kanalizacji sanitarnej  
DN 200mm dł. ok. 469m,  
DN 250mm dł. ok. 2084m,
- przepompownie ścieków - 2 szt.
- rurociąg tłoczny  
DN 90mm dł. ok. 24m,  
DN 110mm dł. ok. 5m,  
DN 125mm i dł. ok. 1445m,  
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 12 273 111 zł.

Grupa I.

2018 - 2025 - dokumentacja projektowa


2025 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

Planowane przekazanie do Działu przetargów  
II – III kwartał 2025

## 4. Zadania w trakcie projektowania




# Zadanie inwestycyjne 5-11-17-170-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w Robakowie i Gądkach - etap I

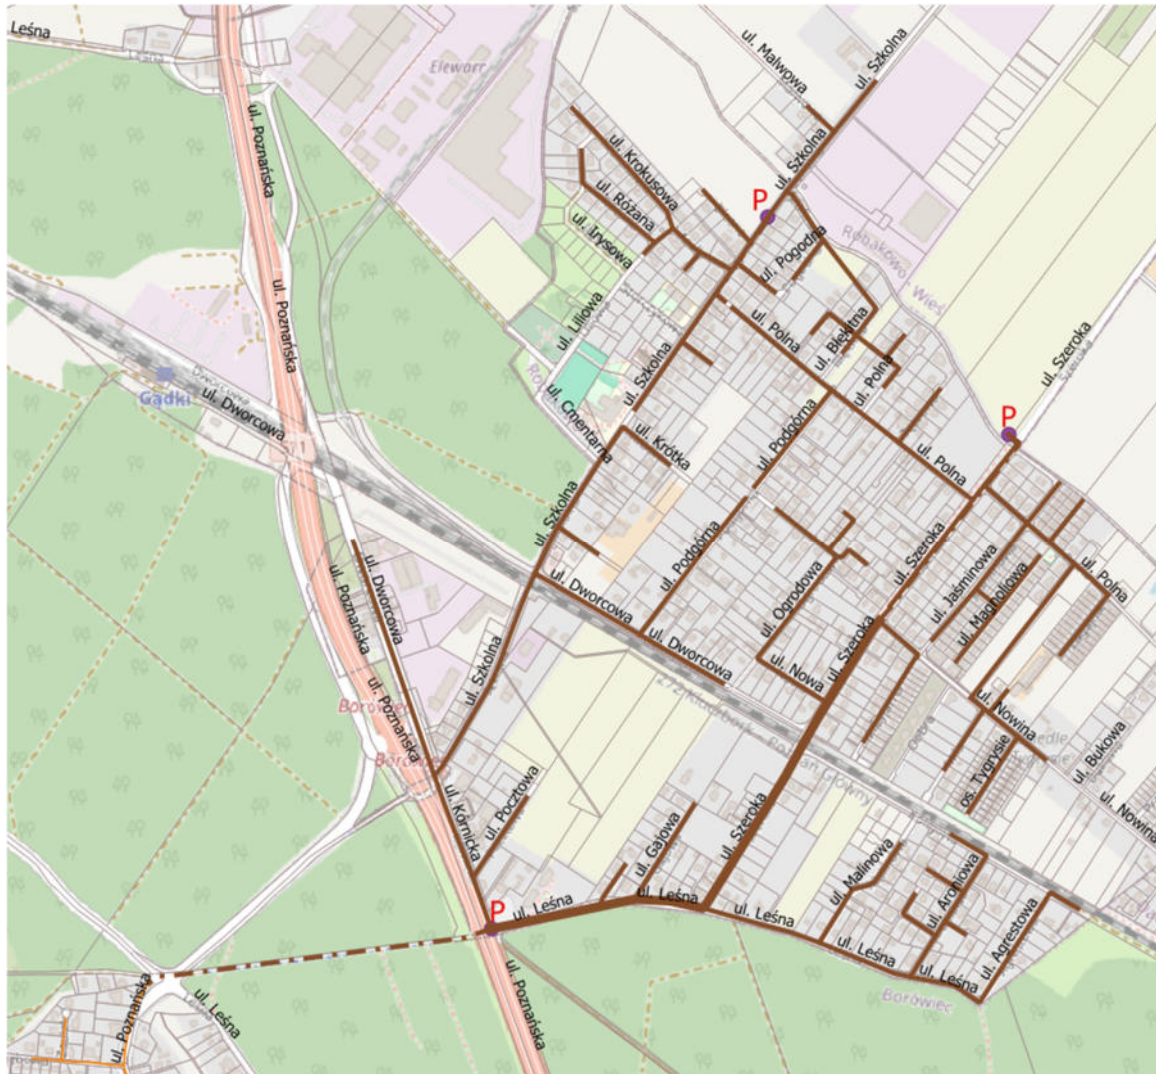

- Zakres:  
Budowa
- kanalizacji sanitarnej  
DN200 dł. 10200m, DN250 dł. 860m,  
DN300 dł. 110m, DN400 dł. 10m,  
DN500 dł. 970m
  - rurociągi tłoczne:  
DN80 dł. 250m, DN225 dł. 415m,  
DN250 dł. 620 m
  - przepompownie - 3 szt.  
wraz z przyłączami
- Łączne nakłady: 42 677 011 zł.  
Grupa I.
- 2023 - 2026 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu  
na problemy terenowo-prawne i projekt kolei  
szybkiej prędkości CPK – wstrzymanie  
wydawania decyzji lokalizacyjnych)
- 2027 - 2030- roboty budowlano-montażowe
- Zadanie powiązane z zad.:  
3-11-20-236-0 - Kórnik – sieć wodociągowa  
w Robakowie i Gądkach - etap I

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-242-1

Kórnik - sieć wodociągowa na osiedlach: Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy.

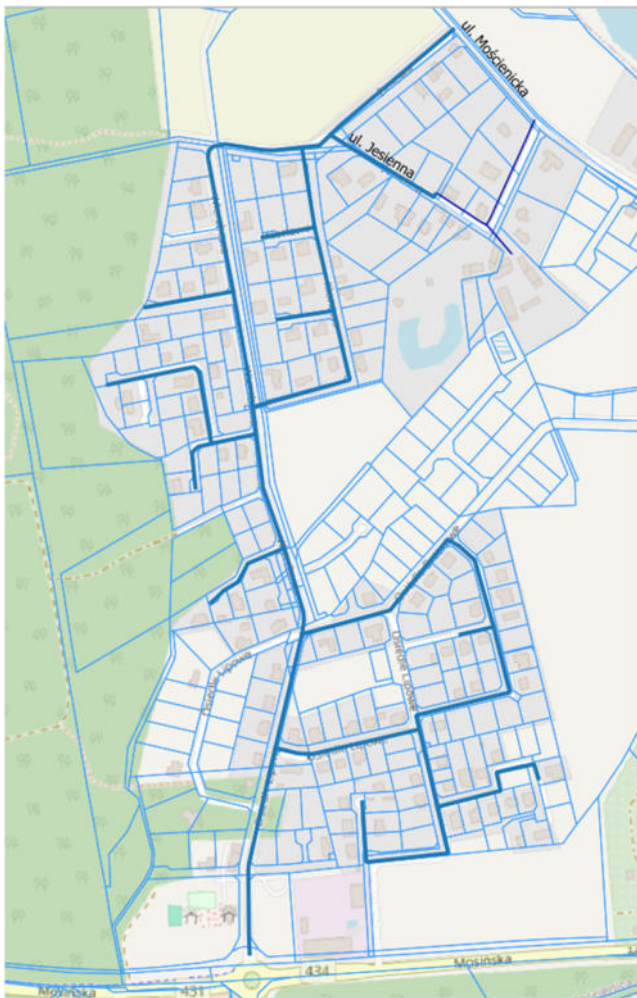

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:


- DN 150mm dł. 1270m,
  - DN 100mm, dł. 3430 m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 250 532 zł.

Grupa II.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(etap uzgodnienia branżowego)

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-241-1  
Kórnik - sieć wodociągowa na os. Międzylesie w Czołowie.

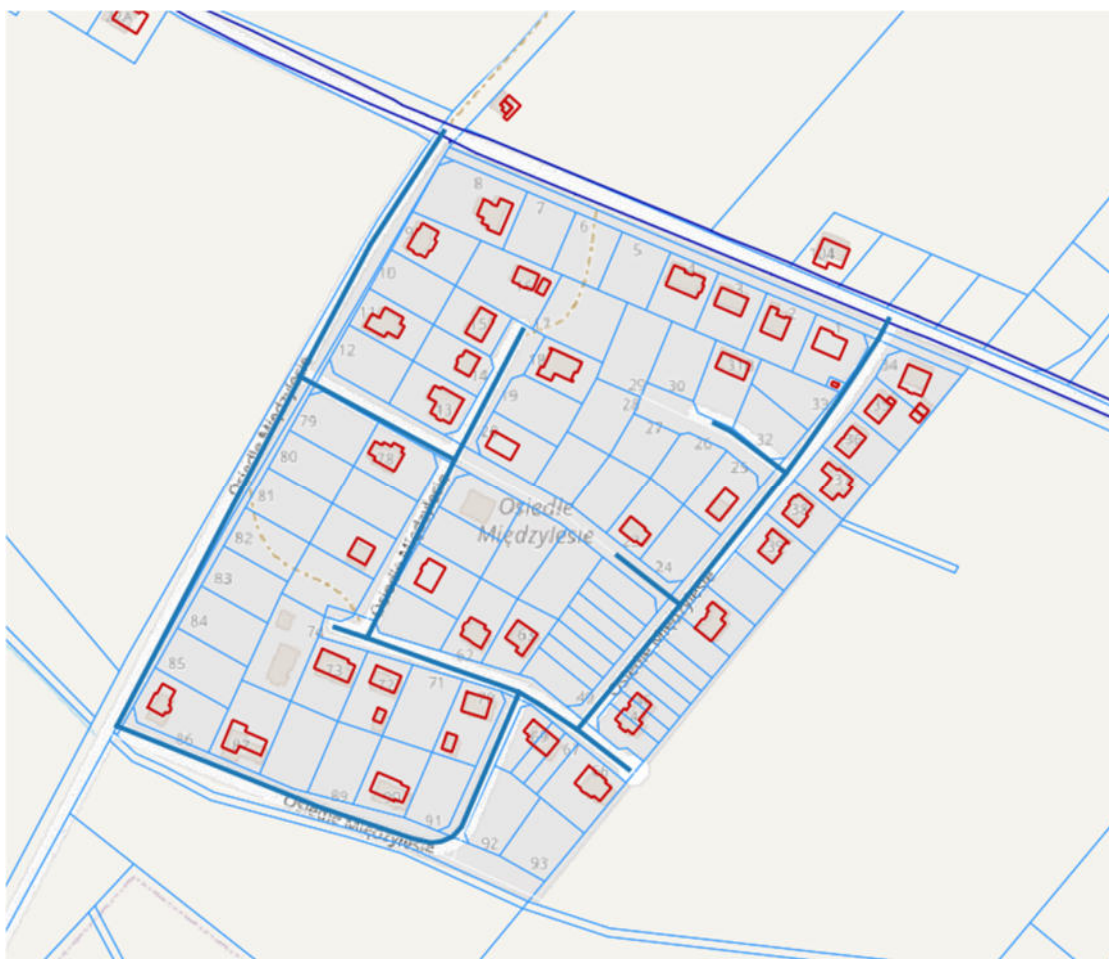

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej  
- DN 200mm, dł. 320 m,  
- DN 100mm, dł. 1150m  
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 3 834 299 zł.

Grupa II.

2022 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu  
na problemy terenowo-prawne)

2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 3-11-20-110-1  
Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Świerkowej w Borówcu



Zakres:  
Budowa sieci wodociągowej:  
DN 100mm, dł. 180m wraz z przyłączami.


Łączne nakłady: 389 372 zł.

Grupa II.

2023 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu na  
problemy z uzgodnieniem projektu  
organizacji ruchu z drogami powiatowymi)  
2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe

## Zadanie inwestycyjne 3-11-18-096-1

### Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Sportowej w Kamionkach

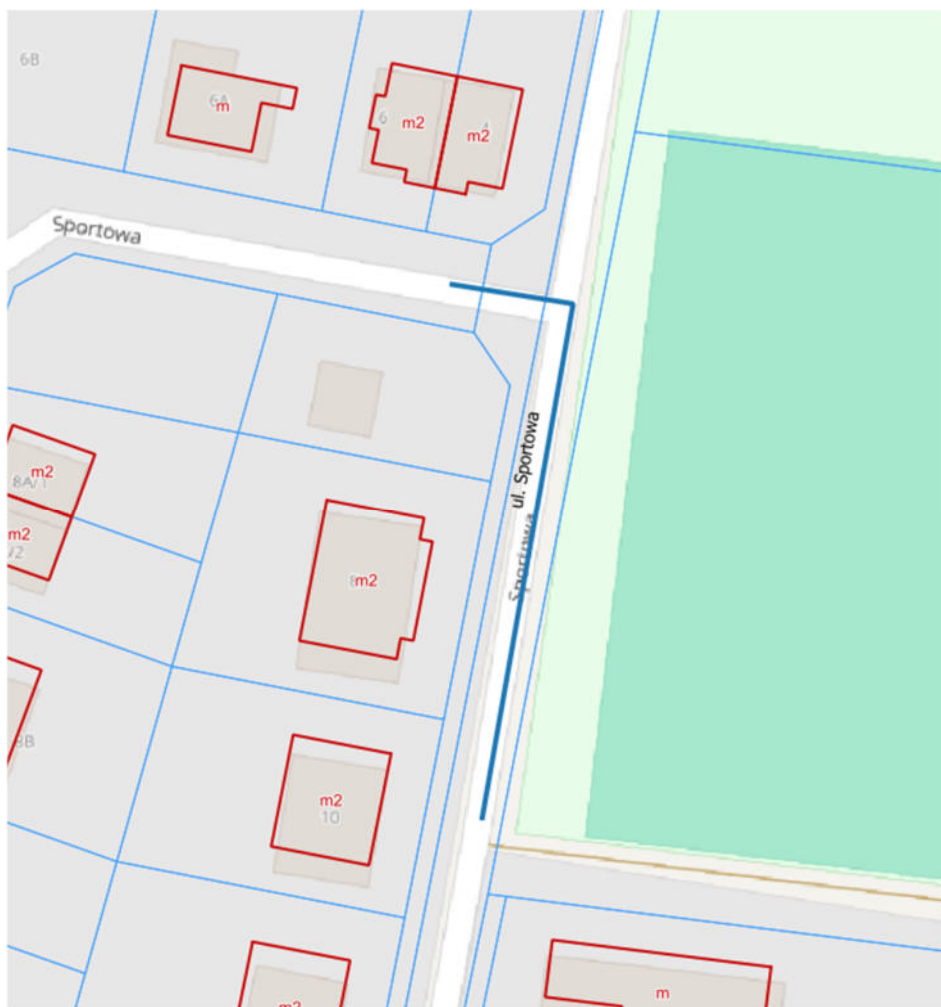

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:  
DN 100mm, dł. 115m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 450 542 zł.

Grupa II.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu  
na problemy terenowo-prawne)  
2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe


Zadanie powiązane z zad.:

5-11-16-097-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna  
w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach  
5-11-19-229-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna  
w ul. Piaskowej w Kamionkach



## Zadanie inwestycyjne 5-11-16-097-1

### Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach

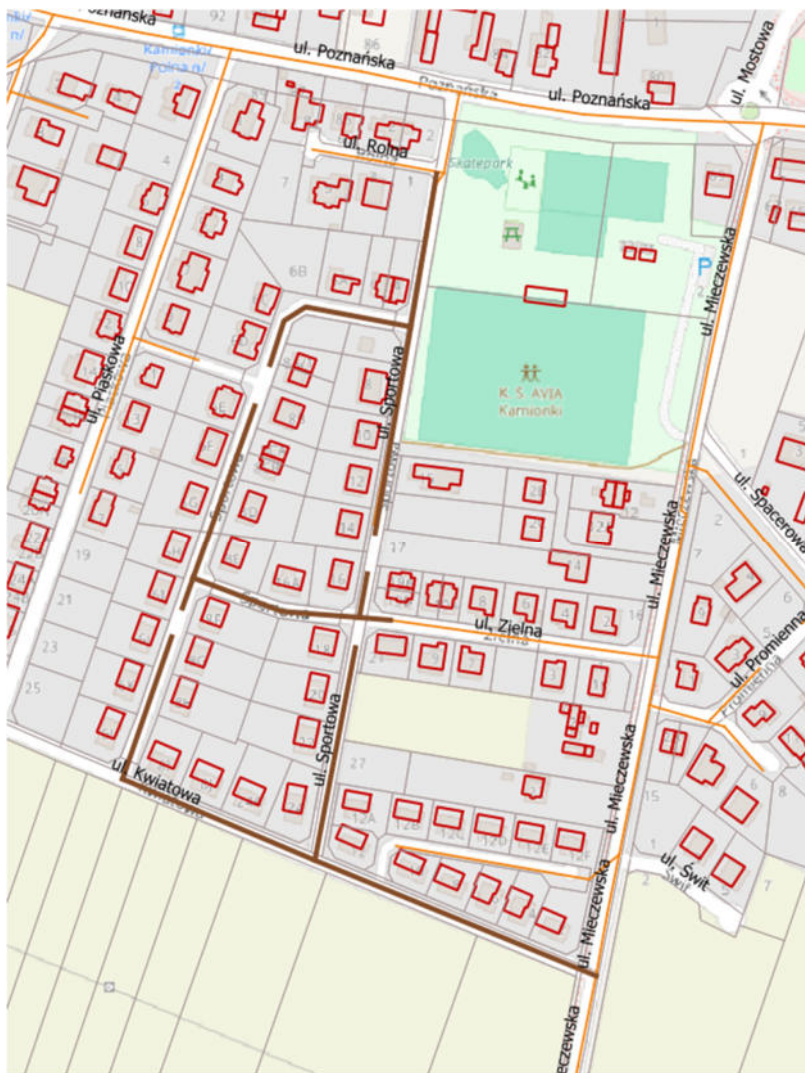

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej:

- DN 250mm- dł. 260 m,
  - DN 200mm- dł. 545m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 363 029 zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu  
na problemy terenowo-prawne)

2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe


Zadanie powiązane z zad.:

3-11-18-096-1 - Kórnik – sieć wodociągowa  
w ul. Sportowej w Kamionkach

5-11-19-229-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna  
w ul. Piaskowej w Kamionkach

## Zadanie inwestycyjne 5-11-19-229-1

## Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Kamionkach

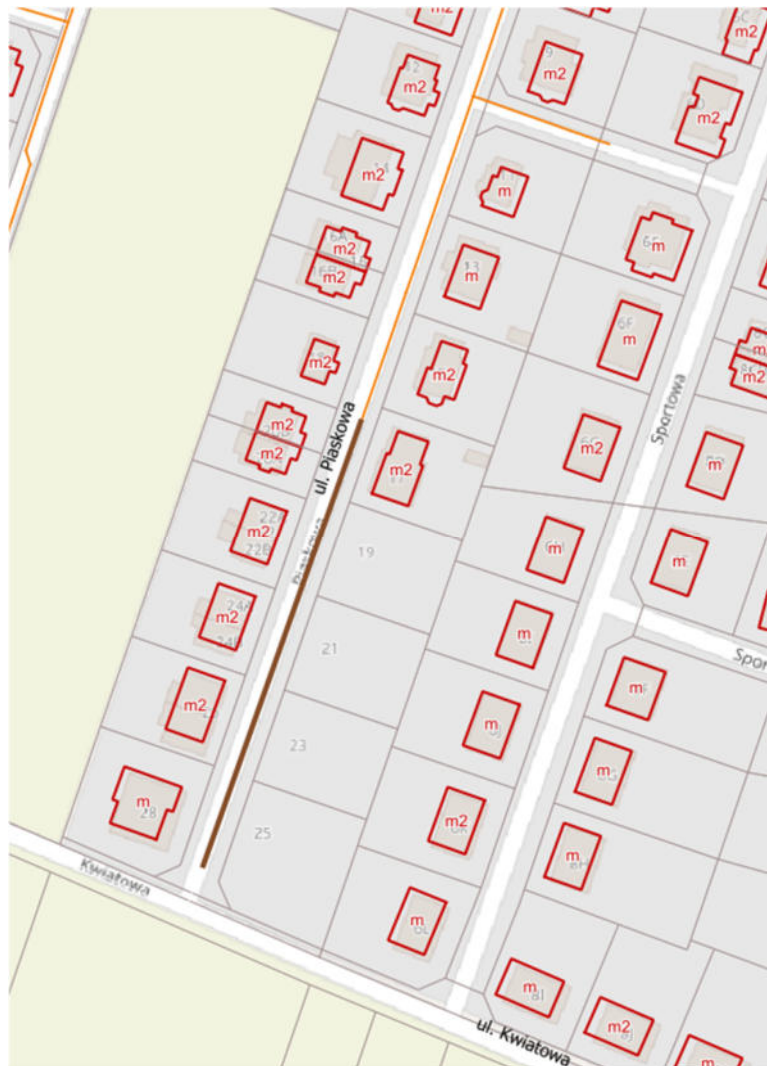

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej  
DN 200mm, dł. 105 m  
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 378 572 zł.

Grupa I.

2021 - 2024 - dokumentacja projektowa

2025 - 2026 - roboty budowlano - montażowe


Wspólna realizacja z zad.:

5-11-16-097-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna  
w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach

3-11-18-096-1 - Kórnik – sieć wodociągowa  
w ul. Sportowej w Kamionkach

## Zadanie inwestycyjne 3-11-21-102-0

Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie pl. Powstańców Wlkp.

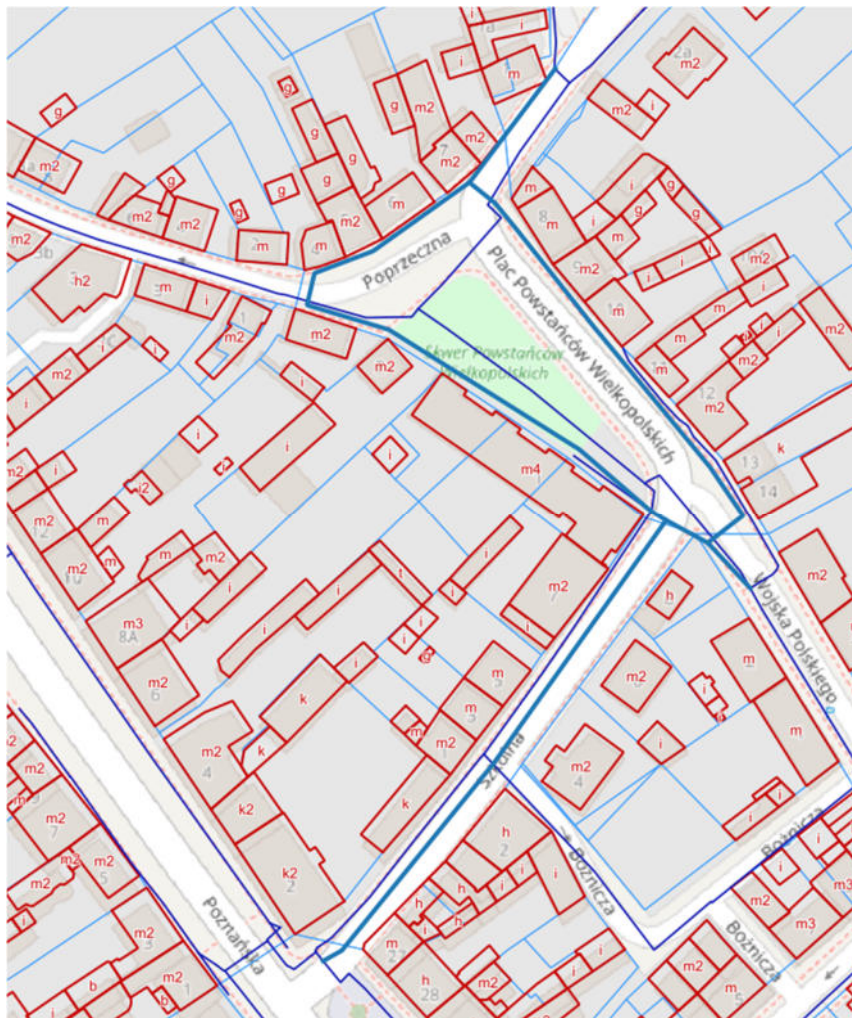

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:

DN 150mm, dł. 454m wraz z przyłączami.

Likwidacja istn. sieci wodociągowych:

DN 50mm, DN 80mm, DN 100mm,

DN 150mm, dł. 413m.

Łączne nakłady: 1 688 866 zł.


Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa

2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe

Koordinacja z budową kanalizacji deszczowej przez UMiG.

Zadanie inwestycyjne 3-11-17-007-1 Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. 20 Października  
 Zadanie inwestycyjne 3-11-17-173-0 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Szarych Szeregów

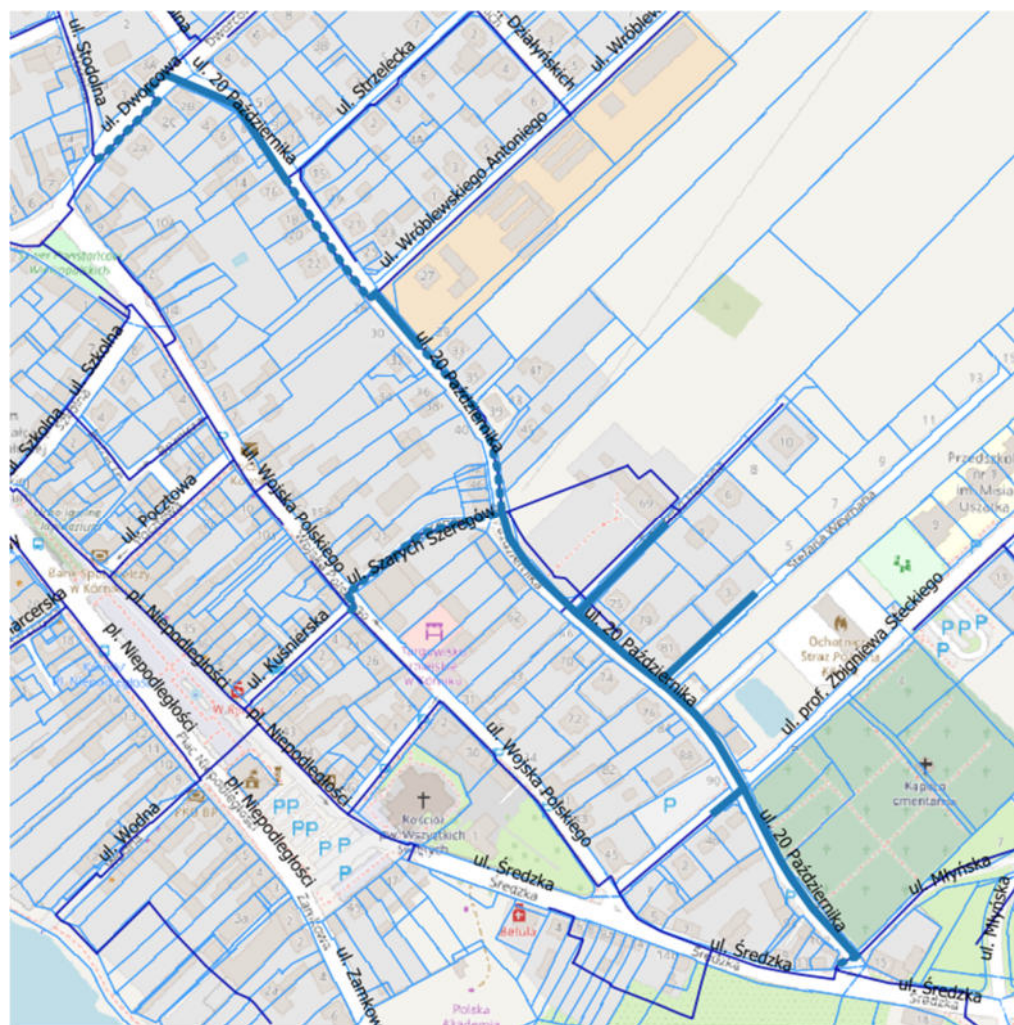

Zakres:  
 (17-007) Budowa i wymiana sieci wodociągowej  
 DN 100mm, dł. 159m  
 DN 150mm, dł. 856m  
 wraz z przyłączami.  
 Łączne nakłady: 2 549 522 zł.  
 Grupa II.


(17-173) Wymiana sieci wodociągowej  
 DN 100mm, dł. 121m wraz z przyłączami.  
 Łączne nakłady: 310 272 zł.  
 Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa  
 (termin może ulec zmianie ze względu na brak  
 działań ze strony biura projektowego)  
 2025 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

Zadania powiązane z zad.:  
 5-11-18-005-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna  
 w rejonie ul. 20 Października

## Zadanie inwestycyjne 5-11-18-005-1

## Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 20 Października

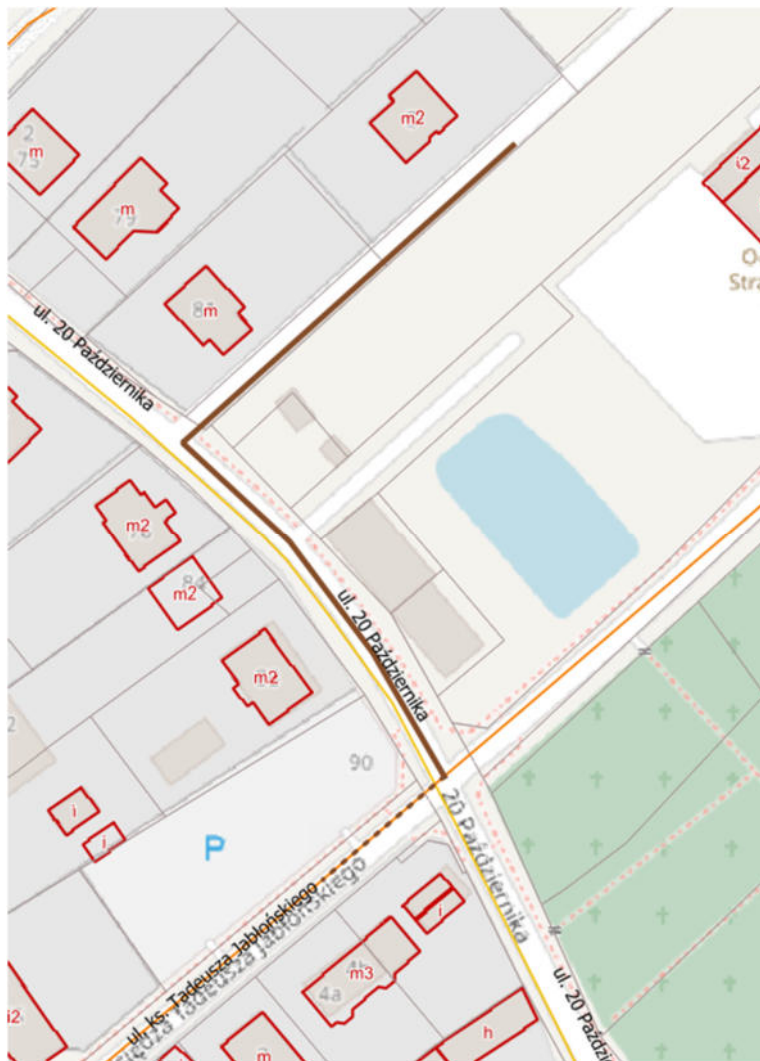

## Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej  
DN 200mm, dł. 182 m wraz z przyłączami.  
Przebudowa istn. kanału DN 200mm, dł. 30m.

Łączne nakłady: 494 656 zł.

## Grupa I.


2021 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu na  
brak działań ze strony biura projektowego)  
2025 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

## Zadanie powiązane z zad.:

3-11-17-173-0 - Kórnik - sieć wodociągowa  
w ul. Szarych Szeregów  
3-11-17-007-1 - Kórnik - sieć wodociągowa  
w rejonie ul. 20 Października

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-320-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Głównej w Dzieńmierowie - etap I

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-321-0 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Głównej w Dzieńmierowie - etap II

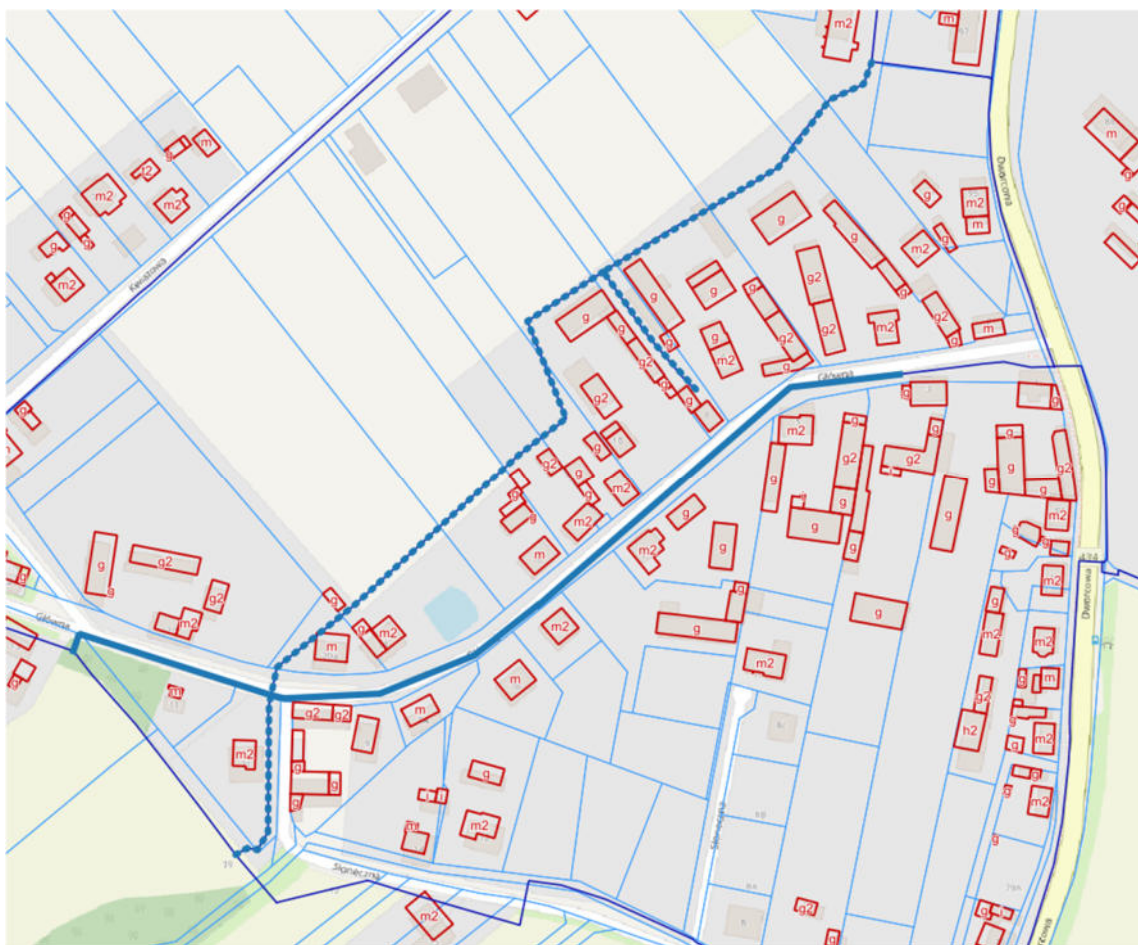

Zakres:

(19-320) Budowa sieci wodociągowej DN 125mm, dł. 120 m wraz z przyłączami  
 Łączne nakłady: 486 314 zł.

Grupa II.

(19-321) Budowa sieci wodociągowej DN 125mm, dł. 260m wraz z przełączeniem i wymianą przyłączy, likwidacja istn. sieci wodociągowej DN 80mm, dł. 510 m.  
 Łączne nakłady: 1 092 274 zł.


Grupa I.

2022 - 2025 - dokumentacja projektowa  
 (termin może ulec zmianie ze względu na problemy terenowo-prawne)

2025 - 2026 - roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 3-11-17-177-0

Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Wspólnej w Szczytnikach

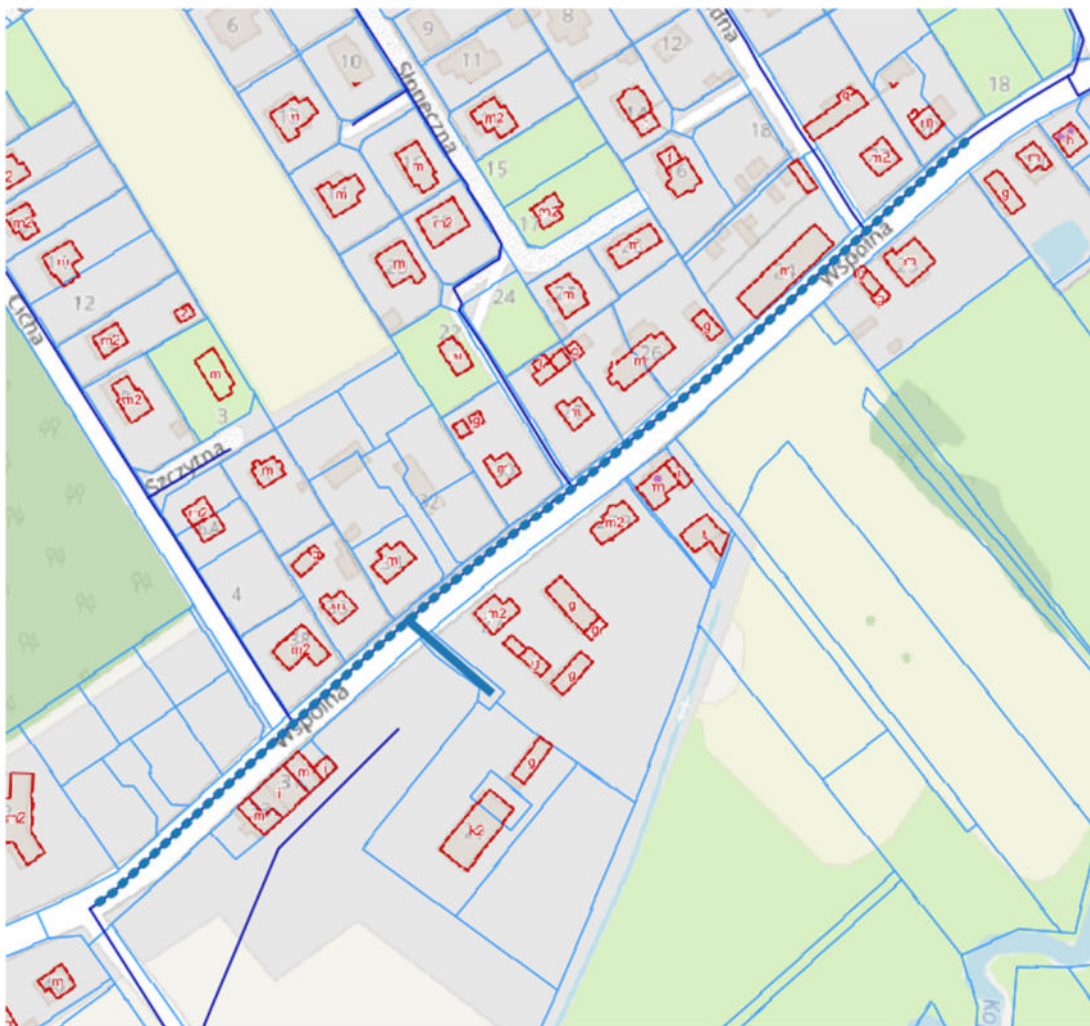

Zakres:

Wymiana i budowa sieci wodociągowej

- DN 200mm, dł. 425m

- DN 100mm, dł. 40m

wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 390 942 zł.

Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa

2026 - 2027 - roboty budowlano-  
montażowe.


Koordinacja z budową drogi przez UMiG.

Zadanie powiązane z zad.:

3-11-19-283-0 Kórnik – sieć wodociągowa  
w ul. Szczególnej w Szczytnikach

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-283-0

Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Szczególniej w Szczytnikach

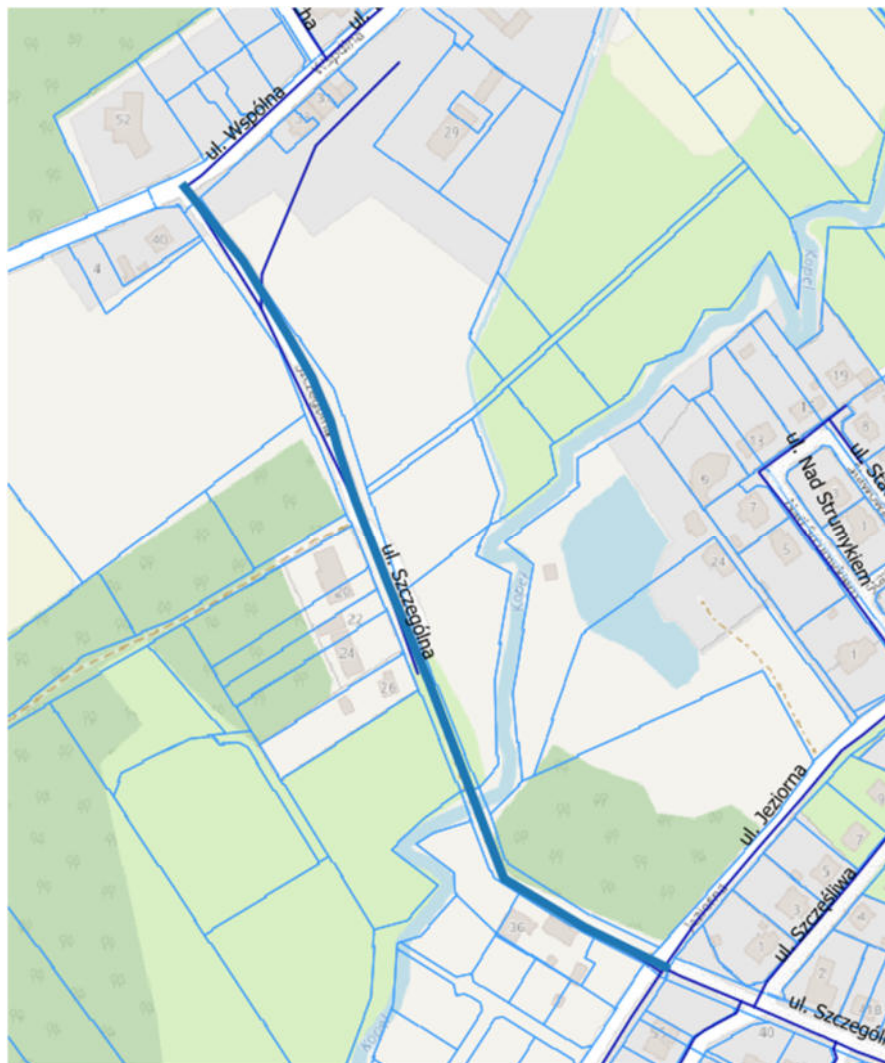

Zakres:

Wymiana i budowa sieci wodociągowej:

- DN 150mm, dł. 500m,
  - likwidacja istn. sieci wodociągowej
  - DN 65mm dł. 285m
  - DN 100mm dł. 40m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 902 685 zł.

Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa

2026 – 2027 - roboty budowlano-  
montażowe

Zadanie powiązane z zad.:

3-11-17-177-0 Kórnik – sieć wodociągowa  
w ul. Wspólnej w Szczytnikach



## Zadanie inwestycyjne 5-11-14-121-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Błazejewo



Zakres:

Budowa

- kanalizacji sanitarnej:
  - DN 200mm, dł. 428m,
  - DN 250mm, dł. 1867m +770m,
- przepompownie ścieków,
- rurociąg tłoczny DN 180mm, dł. 517m +570m
- sieci wodociągowe DN 100, dł. 460m wraz z przyłączami,

Przebudowa:

- przepompowni wraz z ruroc. tłocznym DN 160mm dł. 233m,
- kanalizacji sanitarnej DN 250mm dł. 141m,


Łączne nakłady: 11 090 043 zł.

Grupa I. Dofinansowania – FS7.

2019 - 2025 - dokumentacja projektowa  
2026 - 2028 - roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-097-1

Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Źródlanej w Borówcu

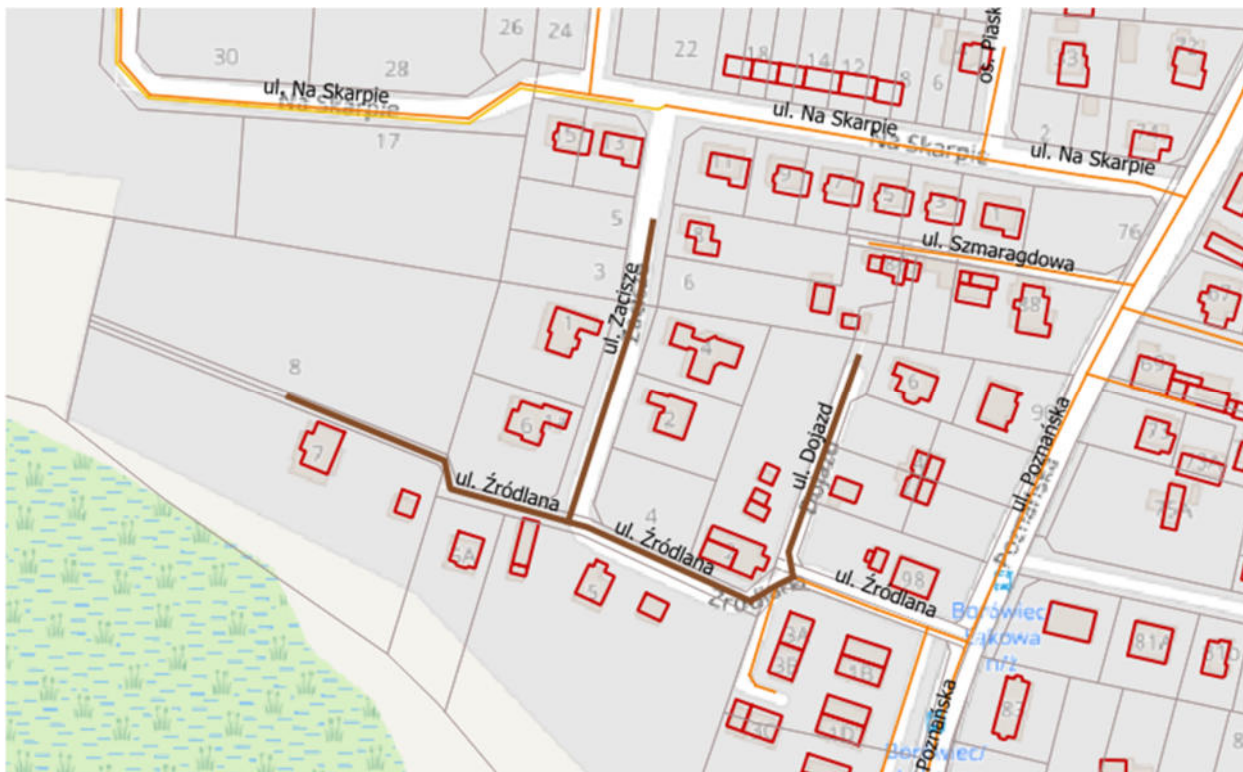

Zakres:

Budowa

- kanalizacji sanitarnej DN200mm, dł. 370m,  
- przepompownia ścieków - 1 szt.  
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 409 781 zł.


Grupa I.

2020 - 2025 - dokumentacja projektowa  
(termin może ulec zmianie ze względu  
na problemy terenowo-prawne)

2025 - 2026 - roboty budowlano-  
montażowe

## Zadanie inwestycyjne 5-11-17-185-1

### Kórnik – kanalizacja sanitarna na os. Azaliowym w Kamionkach

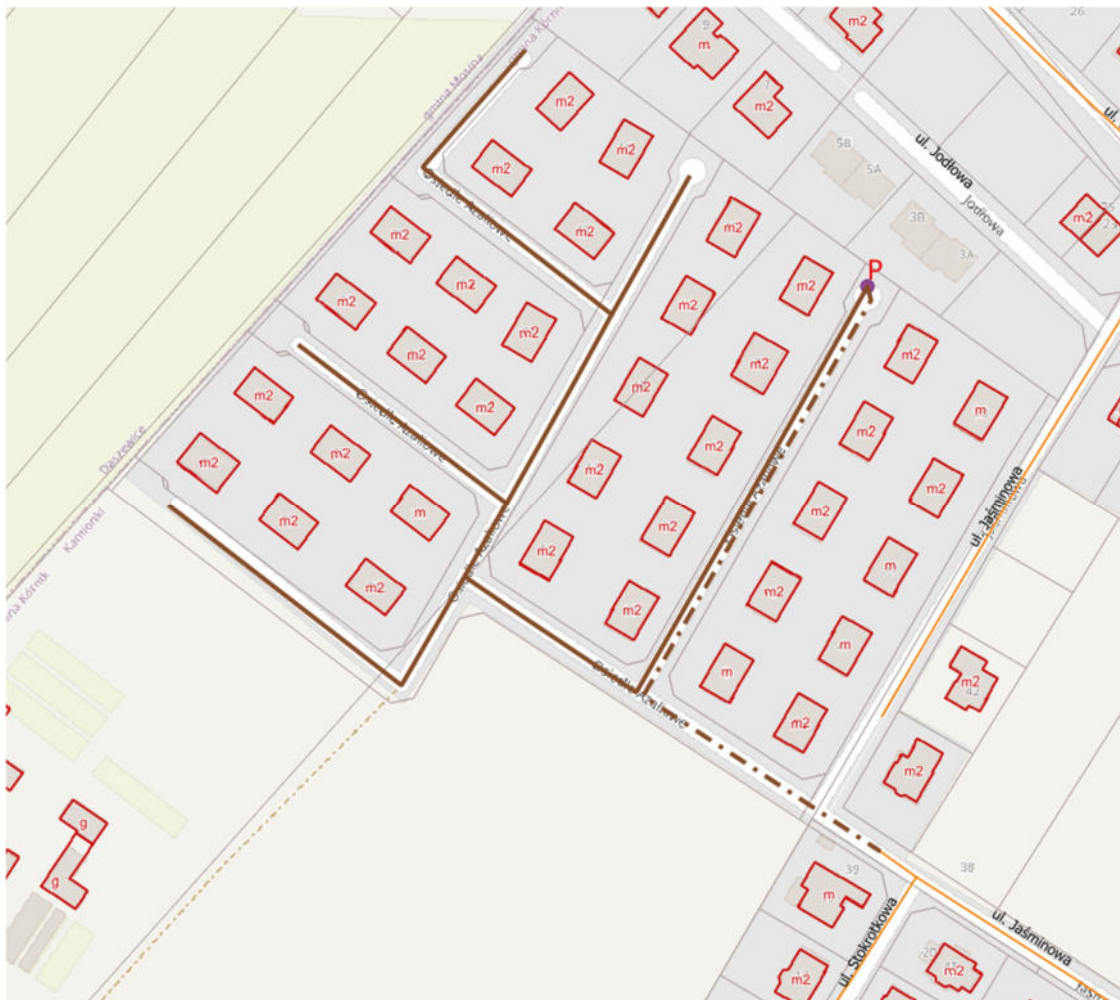

Zakres:

Budowa


- kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. 665m,
  - rurociąg tłoczny DN 80mm, dł. 200m,
  - przepompownia - 1 szt.
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 566 984 zł.

Grupa I.

- 2023 - 2025 - dokumentacja projektowa (termin może ulec zmianie ze względu na problemy terenowo-prawne)
- 2026 - 2028 - roboty budowlano - montażowe

## Zadanie inwestycyjne 5-11-14-095-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Krętej i Prostej w Borówcu

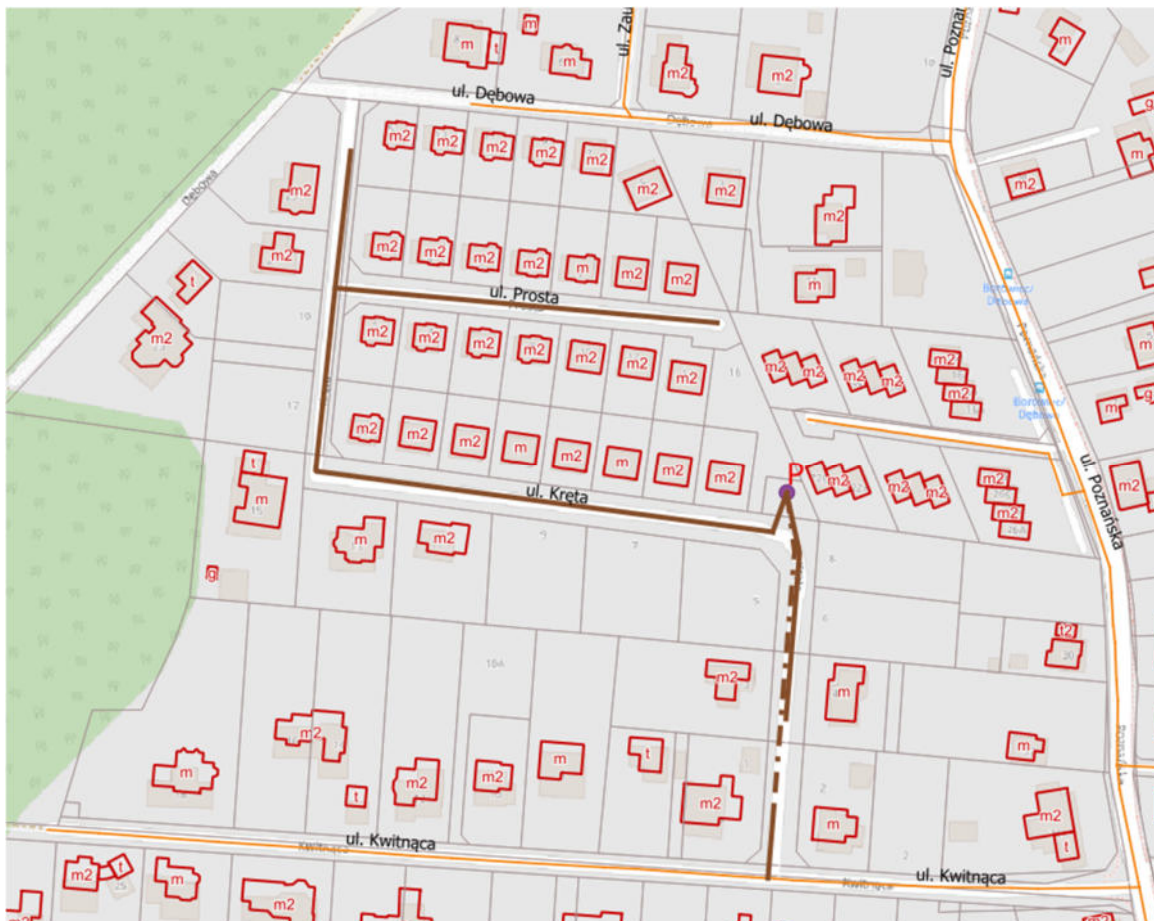

Zakres:

Budowa

kanalizacji sanitarnej

- kanał grawitacyjny DN 200mm, dł. 466m,

- rurociąg tłoczny DN 100mm, dł. 112m,

- przepompownia - 1 szt.

wraz z przyłączami

Łączne nakłady: 2 659 065 zł.


Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2021-2025 - dokumentacja projektowa

2025-2026 - roboty budowlano-  
montażowe

Zadanie inwestycyjne 5-11-13-174-1

Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dziecmierowie

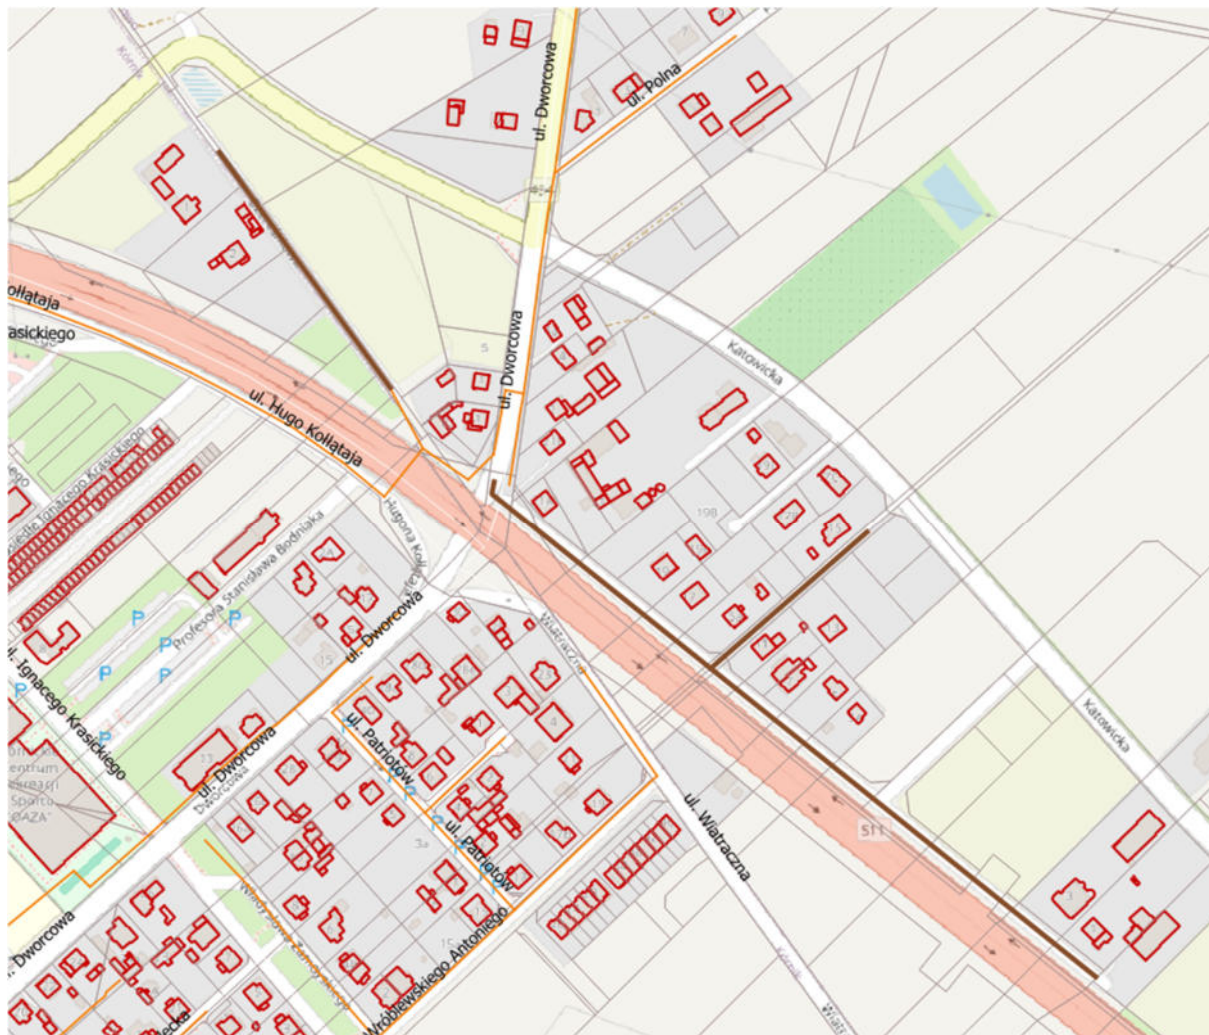

Zakres w ul. Katowickiej:

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Katowickiej:  
DN 200mm dł. 570m wraz z przyłączami.

2025 - 2026 - dokumentacja projektowa  
Postępowanie z 11.2024 r. unieważnione.  
Planowane ogłoszenie nowego  
postępowania II kwartał 2025.  
2027 – 2028 - roboty budowlano-  
montażowe

Łączne nakłady na całe zadanie:  
2 862 908 zł.

Grupa II.

Inwestor zastępczy – Gmina Kórnik.

## 5. Informacja o planowanym zleceniu koncepcji.

W 2025 roku Spółka planuje zlecenie „Koncepcji rozwiązań gospodarki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla gminy Kórnik i Mosina”.

## 6. Nakłady poniesione na inwestycje w Gminie Kórnik w latach 2015-2024.

## Nakłady poniesione na inwestycje w Gminie Kórnik w latach 2015-2024

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	łącznie
12 508 536	4 026 967	1 516 042	9 368 480	2 463 196	8 017 710	5 604 866	50 998 040	18 399 316	31 090 316	<b>143 993 468</b>



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
