

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2026-2029 (WPRiM)

Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik

Dział Techniczny

19.03.2026 r.

Plan prezentacji

1. Zestawienie liczby zadań inwestycyjnych.
2. Zadania zakończone w 2024, 2025 i 2026 r.
3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych.
4. Zadania w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe.
5. Zadania z zakończoną dokumentacją projektową.
6. Zadania w trakcie projektowania.
7. Zadania w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową.
8. Zestawienie zadań, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Zestawienie zadań, dla których planowane jest zlecenie Koncepcji.


* prezentacja zawiera dane aktualne na 09.03.2026 r.

1. Zestawienie liczby zadań inwestycyjnych

Etap zadania	Liczba zadań
Zadania zakończone w 2024, 2025 i 2026 r.	5
Zadania w trakcie robót budowlano - montażowych	8
Zadania w trakcie przetargu na roboty budowlano-montażowe	3
Zadanie z zakończoną dokumentacją projektową	2
Zadanie w trakcie projektowania	16
Zadania w trakcie przetargu na dokumentację projektową	4
Zadania zaplanowane do uruchomienia dokumentacji projektowej	5
Zadania, dla których planowane jest zlecenie Koncepcji	3

2. Zadania zakończone w 2024, 2025 i 2026 r.

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-244-1
 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Poranek w Koninku.

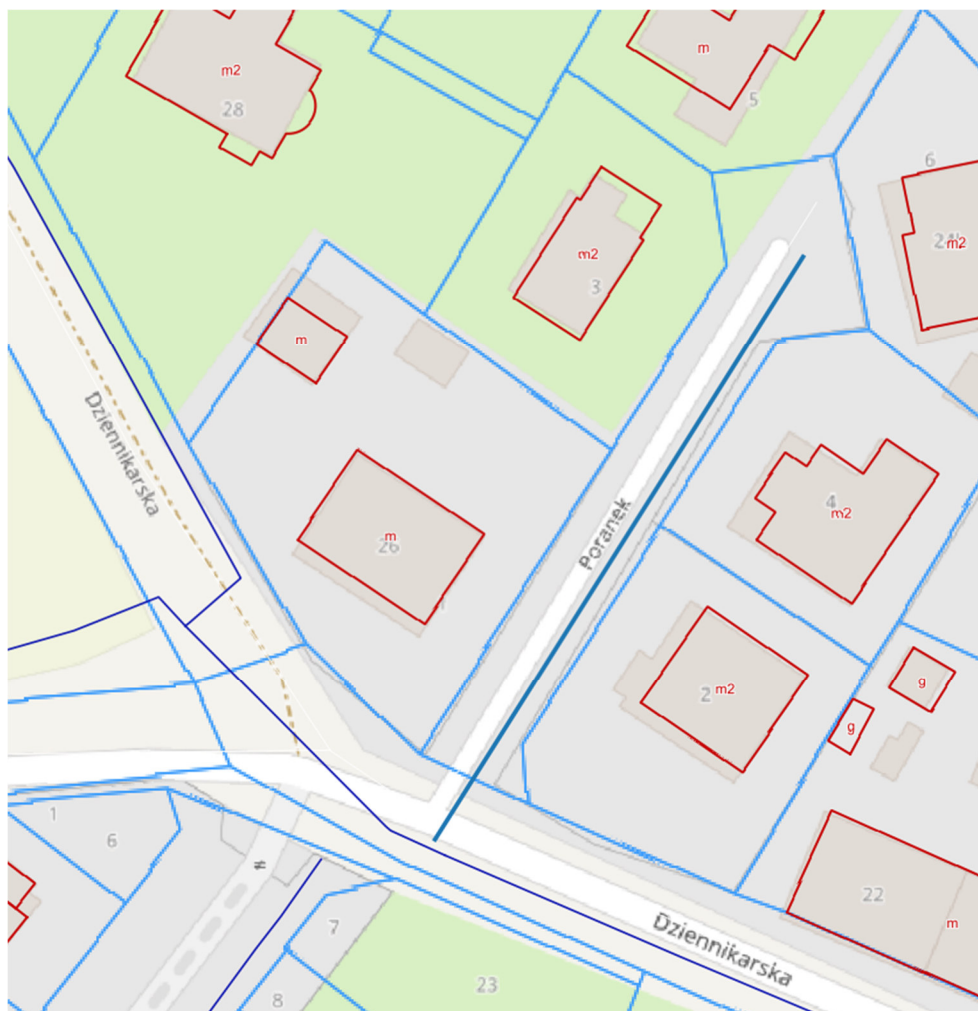

Zakres:
 Budowa sieci wodociągowej w ul. Poranek:
 DN100 dł. 74m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 364 tys zł.

Grupa II.

Podpisane umowy	Podłączenia	Efekt podłączeń
3	3	100%

Zadanie inwestycyjne 3-11-17-184-1
Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Miętowej w Skrzynkach




Zakres:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Miętowej
i Jeziornej:
DN100 dł. 315 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 488 tys. zł.

Grupa II.

Podpisane umowy	Podłączenia	Efekt podłączeń
9	9	100%

Zadanie inwestycyjne 3-11-06-011-1 Kórnik - magistrala wodociągowa

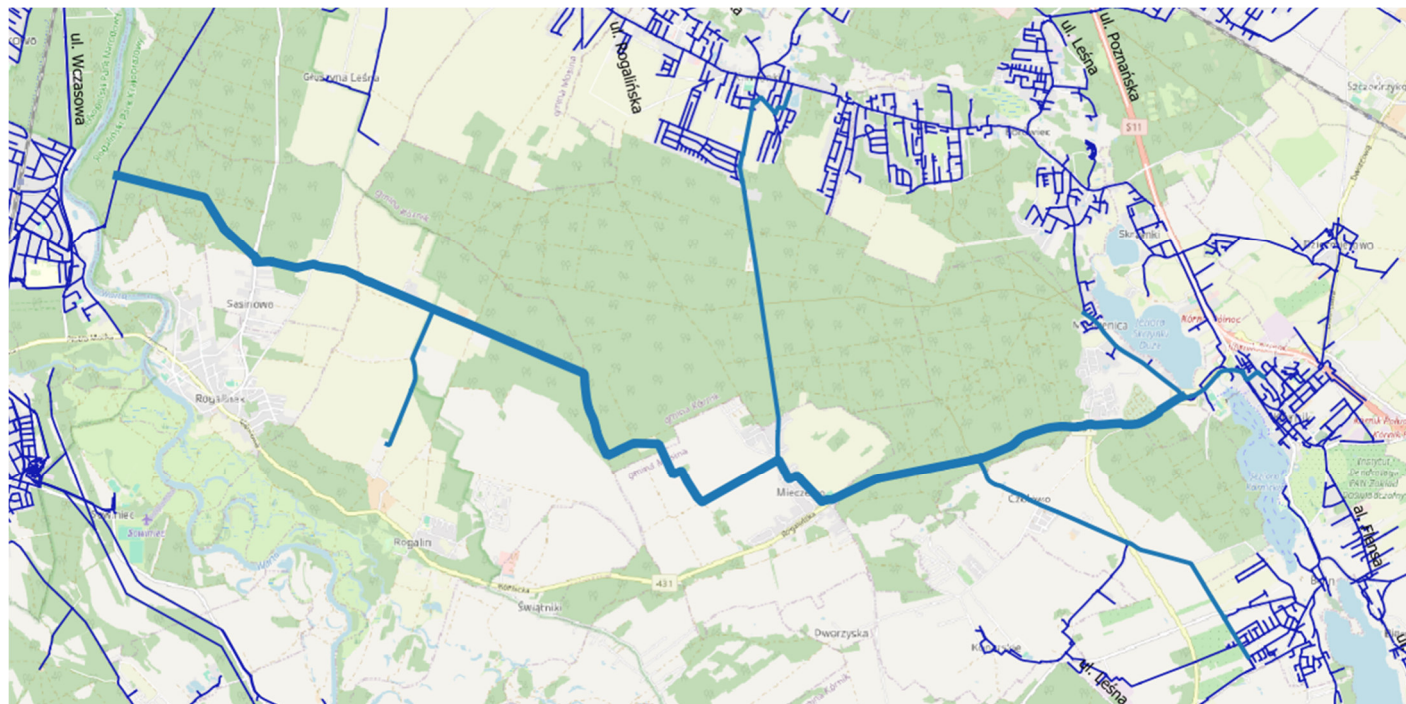

Zakres:

Budowa magistrali wodociągowej:

DN500 dł. 15,2 km,

DN400 dł. 2,6 km,

DN300 dł. 6,6 km,

DN250 dł. 5,4 km,

DN200 dł. 2,9 km.


Łączna dł. 32,7 km.

Łączne nakłady: 75 377 tys. zł.

Grupa I.

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-340-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Ładnej w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 5-11-19-341-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Ładnej w Borówcu

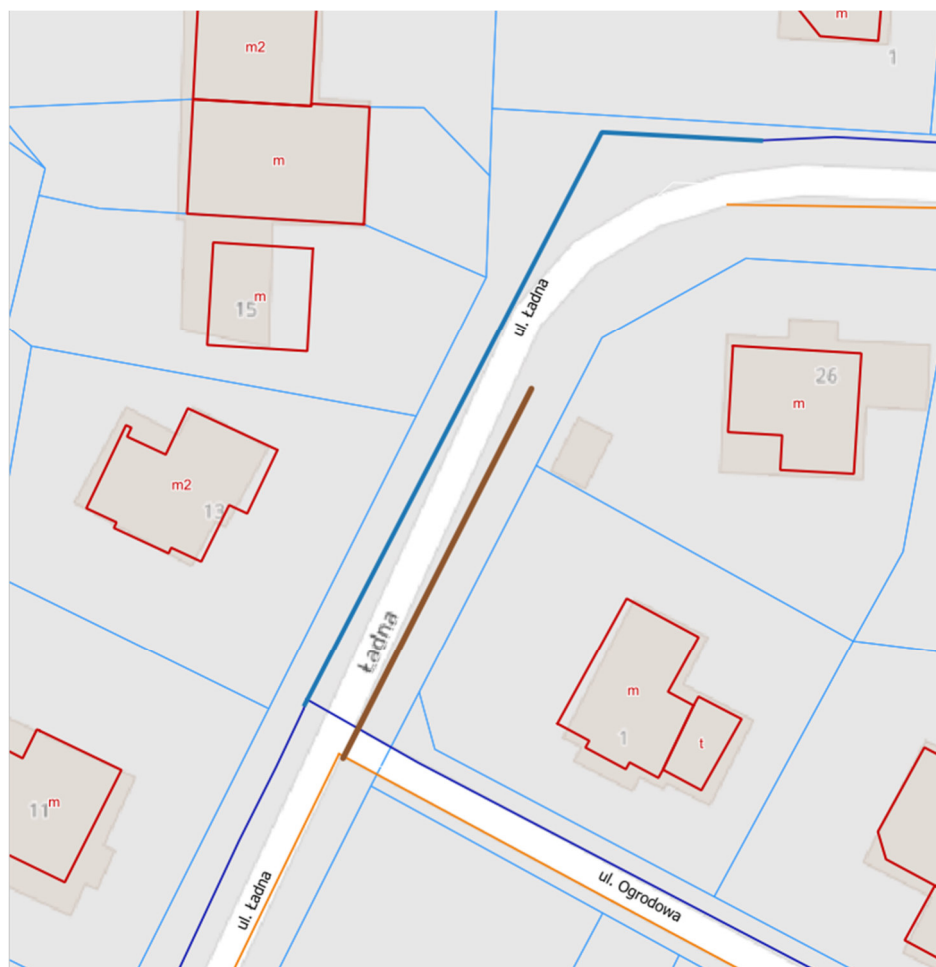

Zakres:

(19-340) Budowa sieci wodociągowej w ul. Ładnej:
DN100 dł. 75m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 123 tys. zł,
w tym we WPRiM 50 tys. zł.

(19-341) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ładnej:
DN200 dł. 40m wraz z przyłączami.


Łączne nakłady: 87 tys. zł,
w tym we WPRiM 20 tys. zł.

Grupa II.

Zadanie zakończone w 01.2026 r. – etap zawiadomienia
mieszkańców o możliwości podłączenia.

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-096-1

Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Widokowej w Borówcu

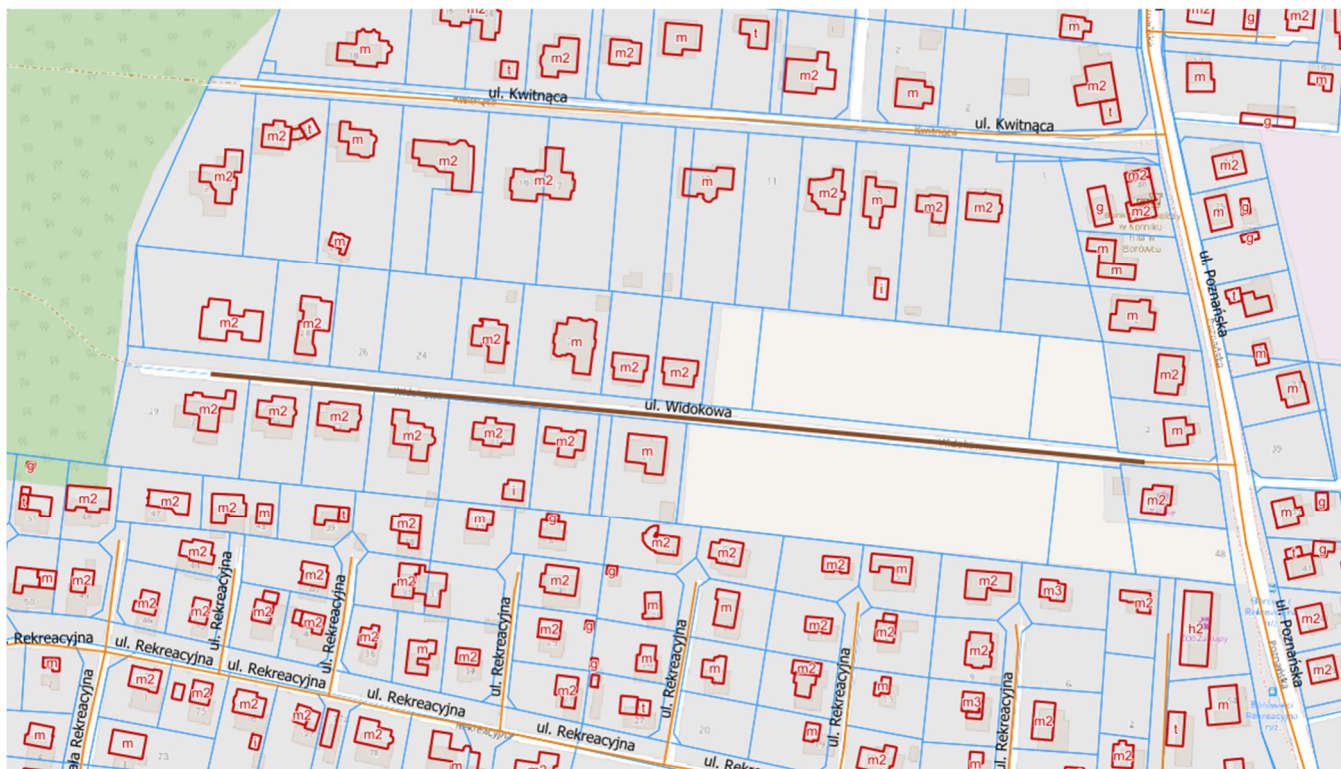

Zakres:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej: DN300 dł. 360m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 286 tys. zł., w tym we WPRiM 300 tys. zł.


Grupa I. Dofinansowania - FS7.

Zadanie zakończone w 02.2026 r. – etap zawiadomienia mieszkańców o możliwości podłączenia.

3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych

Zadanie inwestycyjne 3-11-15-081-1

Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej w Błazejewku.

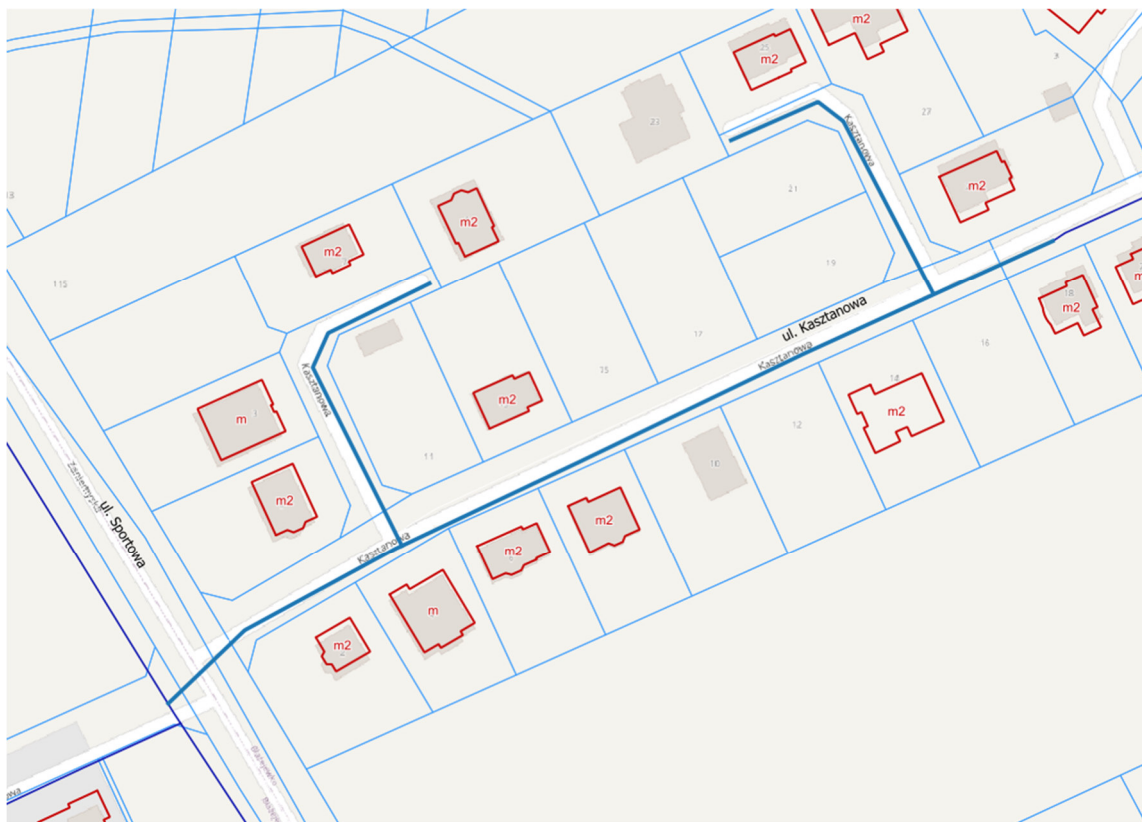

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej:
DN100 dł. 375m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 703 tys. zł,
w tym we WPRiM 325 tys. zł.

Grupa II.

2020 - 2022 - dokumentacja projektowa


2025 - 2026 - roboty budowlano – montażowe

data zakończenia inwestycji zgodnie z umową 02.2026
(z uwagi na warunki zimowe, które uniemożliwiły
wykonanie prac, możliwe opóźnienie o ok. 3 m-ce)

Wspólna realizacja z zadaniem:

3-11-17-024-1 Kórnik - sieć wodociągowa
w ul. Cisowej w Błazejewku

Zadanie inwestycyjne 3-11-17-024-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Cisowej w Błazejewku

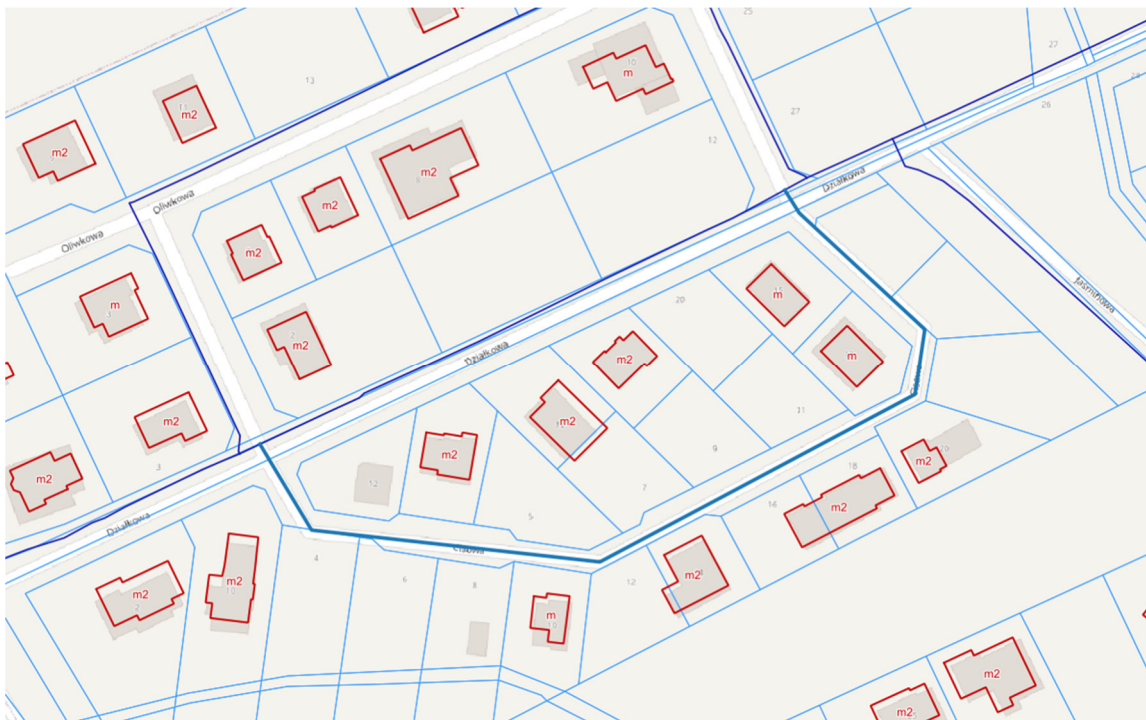

Zakres:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej:
DN100 dł. 230m wraz z przyłączami.


Łączne nakłady: 479 tys. zł,
w tym we WPRiM 185 tys. zł.

Grupa II.

2021 - 2024 - dokumentacja projektowa
2025 - 2026 - roboty budowlano – montażowe
data zakończenia inwestycji zgodnie z umową 02.2026
(z uwagi na warunki zimowe, które uniemożliwiły wykonanie prac, możliwe opóźnienie o ok. 3 m-ce)

Wspólna realizacja z zadaniem:
3-11-15-081-1 Kórnik – sieć wodociągowa
w ul. Kasztanowej w Błazejewku.

Zadanie inwestycyjne 3-11-16-145-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Zielonej w Borówcu.

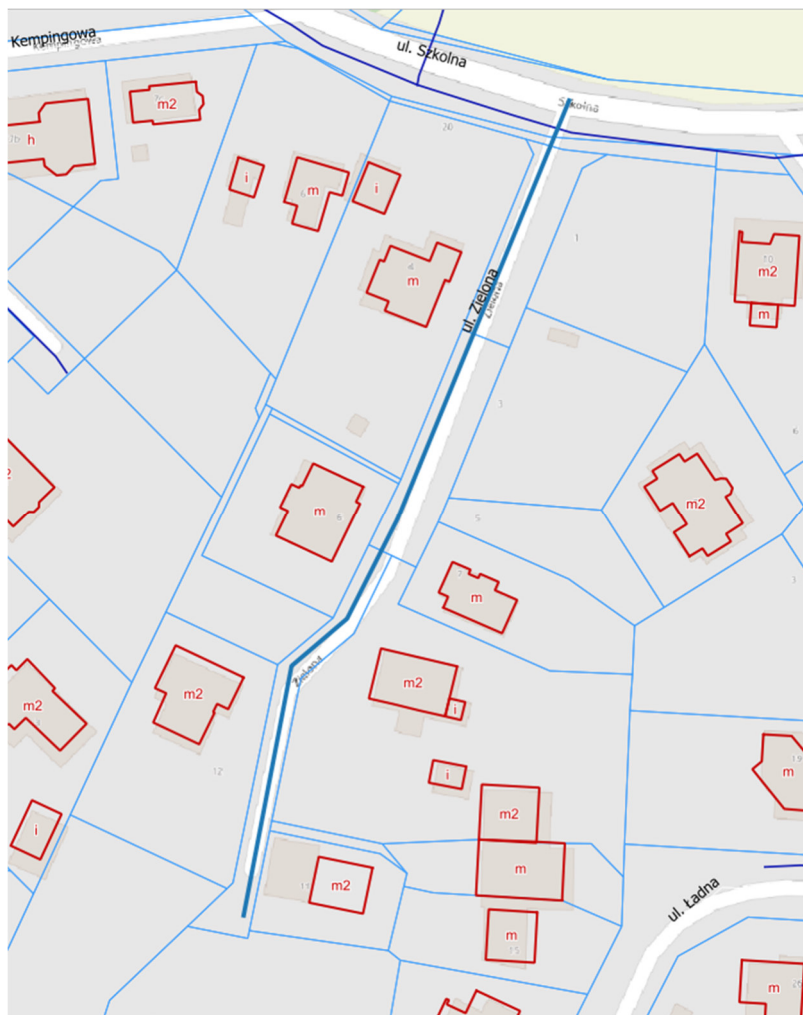

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej :
DN100 dł. 180m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 288 tys. zł.,
w tym we WPRiM 23 tys. zł.

Grupa II.

2021 - 2023 - dokumentacja projektowa

2024 - 2027 - roboty budowlano – montażowe
(zakres wykonany, przekazany do eksploatacji)

Wspólna realizacja z zadaniami:

5-11-14-130-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna
dla m. Skrzynki - Etap I

5-11-14-147-1 Kórnik – rurociąg tłoczny z przepompowni
główniej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu

3-11-19-263-0 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Wiśniowej,
Leśnej i Szkolnej w Skrzynkach

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-129-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Biernatki



Zakres:

Budowa

- kanalizacji sanitarnej
DN200 dł. 3550m
DN250 dł. 131m
 - przepompownie ścieków - 2 szt.
 - rurociąg tłoczny
DN90 dł. 731m
DN110 dł. 4m
DN125 dł. 402m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 14 653 tys. zł.,
w tym we WPRiM 14 601 tys. zł.

Grupa I.

2018 - 2024 - dokumentacja projektowa


2025 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

(data zakończenia umowy: 11.2027 r.)

4. Zadania w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 3-11-14-251-1


Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. Skowronkowej i Wesolej w Szczytnikach, ul. Jaśminowej w Kamionkach i ul. Drapałka w Borówcu

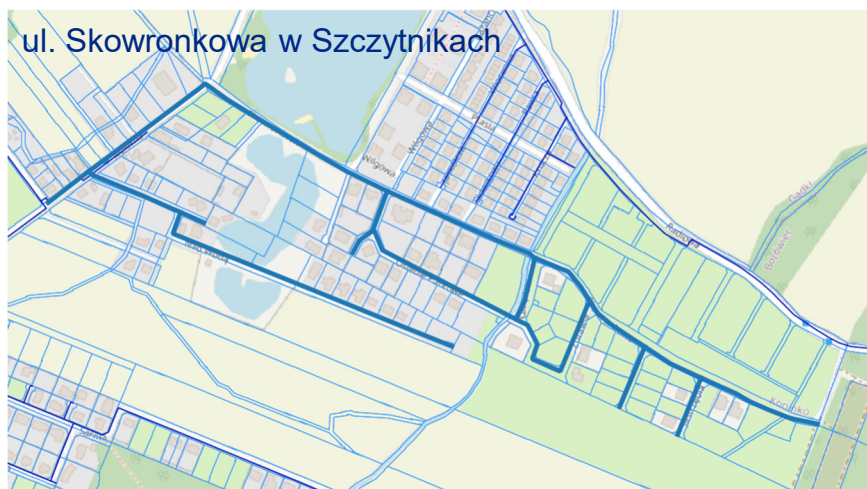


ul. Skowronkowa w Szczytnikach



ul. Wesoleja w Szczytnikach

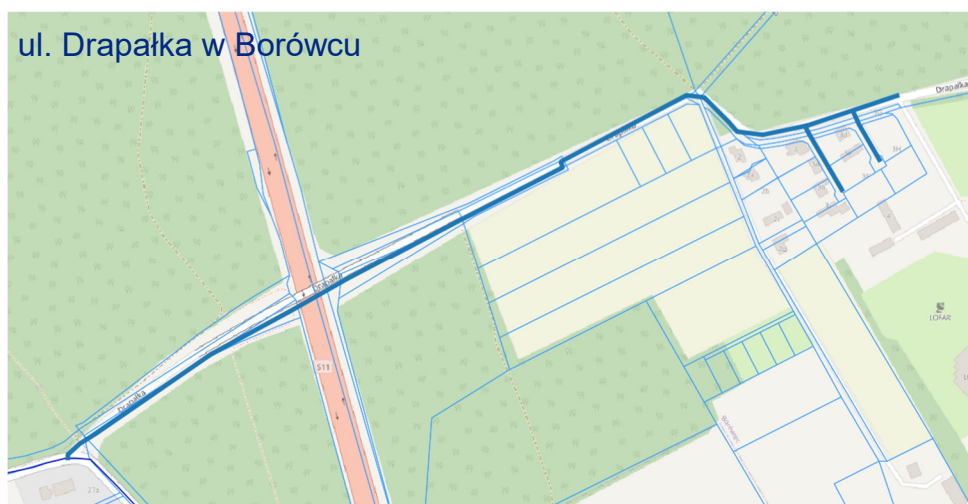

ul. Drapałka w Borówcu

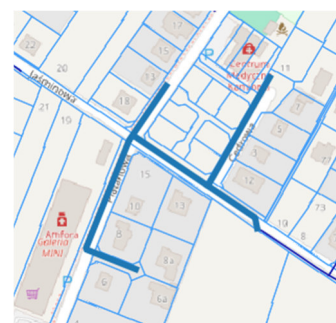

ul. Jaśminowa
w Kamionkach

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:


- w Szczytnikach w ulicach: Cicha, Żurawia, Jastrzębia, Łabędzia, Skowronkowa, Jeziorna, Nad Wodą, Osiedle Parkowe, Wesoleja, boczne od ul. Wesolej
- w Kamionkach w ulicach: Platanowa, Cedrowa, Jaśminowa, boczna od Platanowej,
- w Borówcu w ulicach: Drapałka, boczne od ul. Drapałka:

DN150 dł. 1915m, DN100 dł. 2860m,
DN50 dł. 700m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 9 867 tys. zł.,
w tym we WPRiM 9 863 tys. zł.
Grupa II.

2018 - 2023 - dokumentacja projektowa
2026 - 2028 - roboty budowlano-montażowe
(przetarg ogłoszony – trwa ocena ofert,
część ofert zawiera Rażąco Niską Cenę,
planowany czas realizacji RBM – 24 m-ce)

Zadanie inwestycyjne 3-11-20-110-1
Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Świerkowej w Borówcu

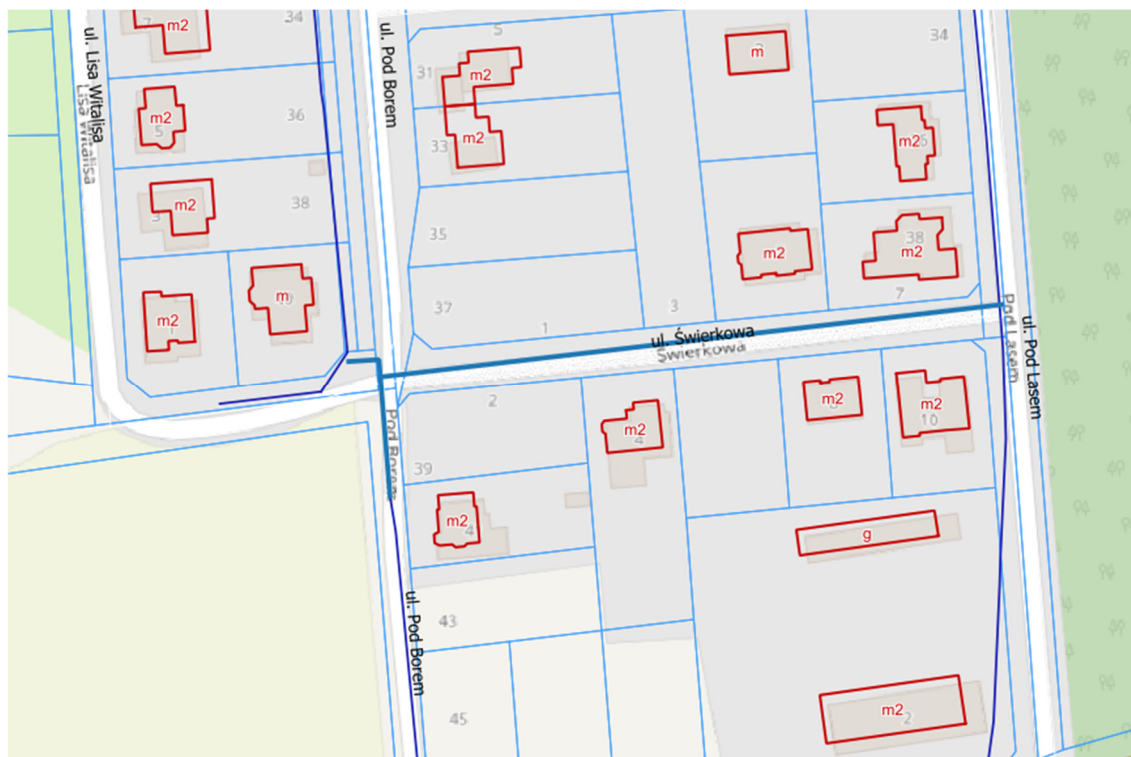

Zakres:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej:
DN100 dł. 180m wraz z przyłączami.


Łączne nakłady: 360 tys. zł.,
w tym we WPRiM 329 tys. zł.

Grupa II.

2023 - 2026 - dokumentacja projektowa
2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
(przetarg ogłoszony – termin składania ofert
15.04.2026 r.
planowany czas realizacji RBM – 6 m-cy)

Zadanie inwestycyjne 3-11-21-102-0

Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie pl. Powstańców Wlkp.

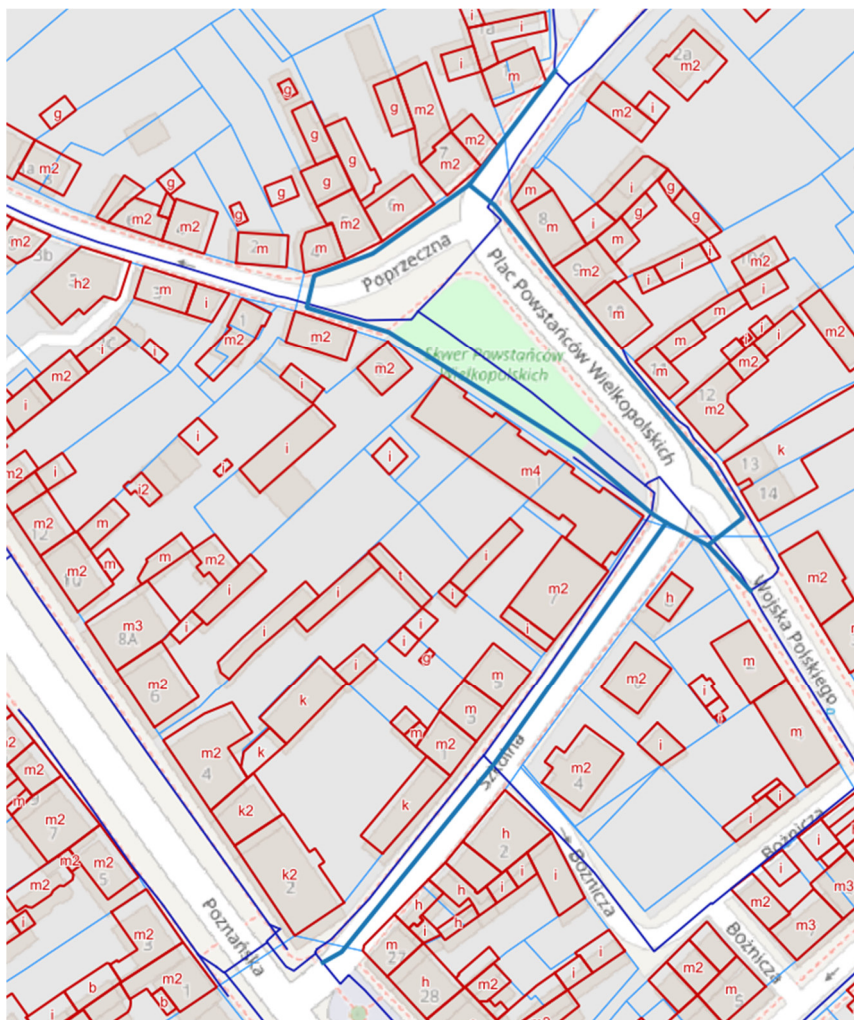

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, Szkolnej i Pl. Powstańców Wlkp.:

DN150 dł. 454m wraz z przyłączami.

Likwidacja istn. sieci wodociągowych:

DN50, DN80, DN100, DN150 dł. 413m.

Łączne nakłady: 1 923 tys. zł.,
w tym we WPRiM 1 908 tys. zł.

Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa


2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

(w trakcie przygotowanie postępowania przetargowego,
planowany czas realizacji RBM – 16 m-cy)

Koordinacja z budową kanalizacji deszczowej przez UMiG.

5. Zadania z zakończoną dokumentacją projektową

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-095-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Krętej i Prostej w Borówcu

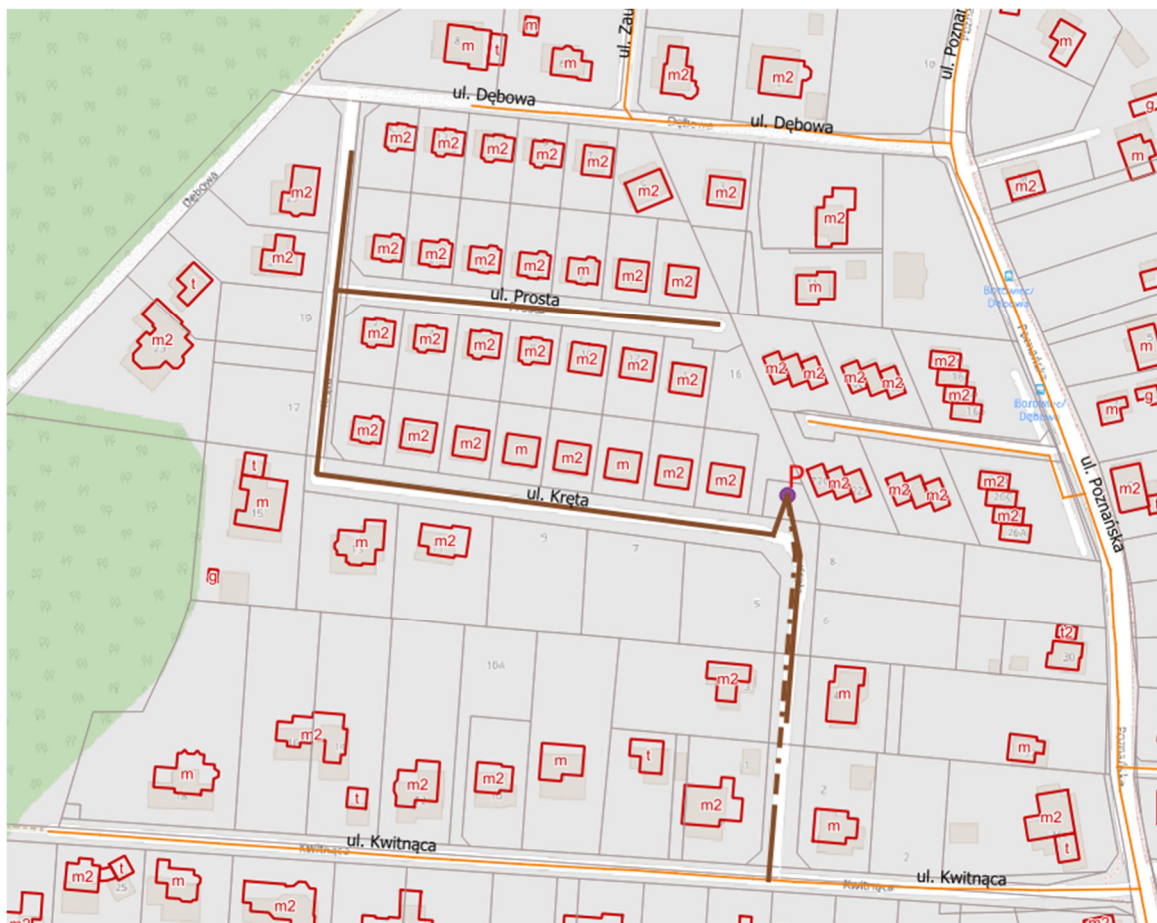

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej i Prostej:

- kanał grawitacyjny DN200 dł. 466m,
 - rurociąg tłoczny DN100 dł. 112m,
 - przepompownia - 1 szt.
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 745 tys. zł.,
w tym we WPRiM 2 694 tys. zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2021-2025 - dokumentacja projektowa

2026-2027 - roboty budowlano-montażowe

(planowane ogłoszenie przetargu - III kwartał 2026 r.,
planowany czas realizacji RBM – 12 m-cy)


Wspólna realizacja z zadaniami:

3-11-18-054-1 - Kórnik - sieć wodociągowa
w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

5-11-19-257-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna
w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 5-11-19-229-1

Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Kamionkach

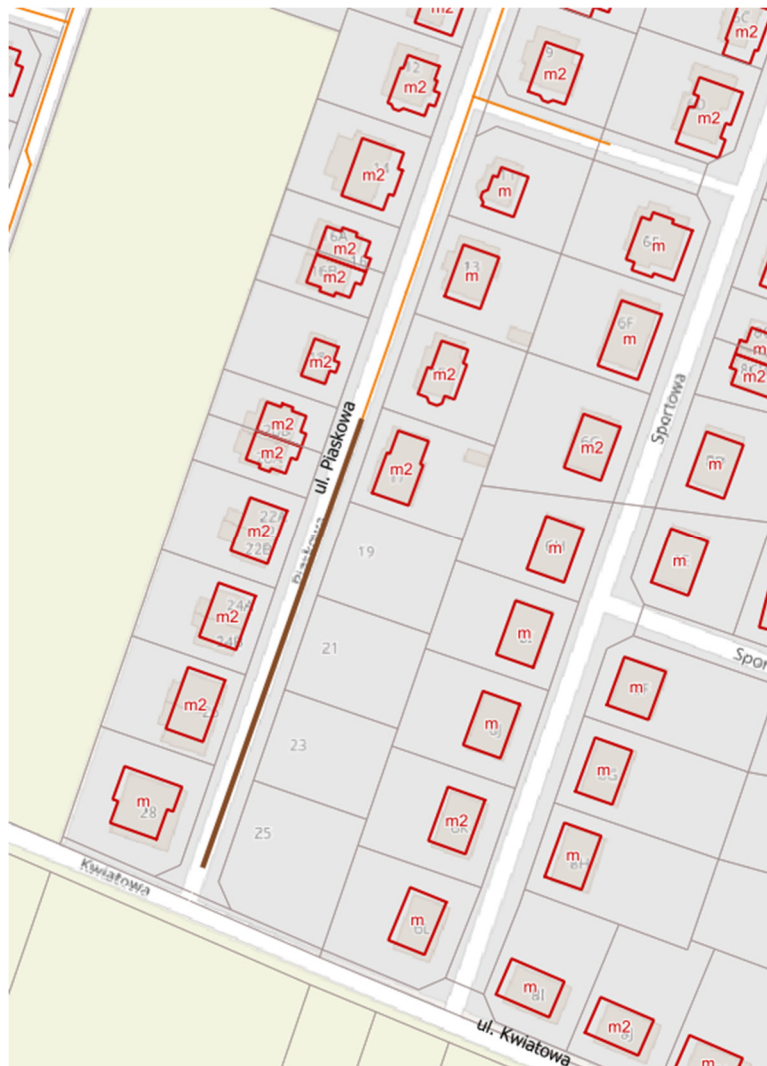

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej:
DN200 dł. 105m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 464 tys. zł.,
w tym we WPRiM 461 tys. zł.

Grupa I.

2021 - 2025 - dokumentacja projektowa

2026 - 2027 - roboty budowlano - montażowe

(planowane ogłoszenie przetargu - III kwartał 2026 r.,
planowany czas realizacji RBM – 6 m-cy)

Wspólna realizacja z zadaniami:


5-11-16-097-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna
w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach

3-11-18-096-1 - Kórnik – sieć wodociągowa
w ul. Sportowej w Kamionkach

6. Zadania w trakcie projektowania

Zadanie inwestycyjne 3-11-18-054-1

Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

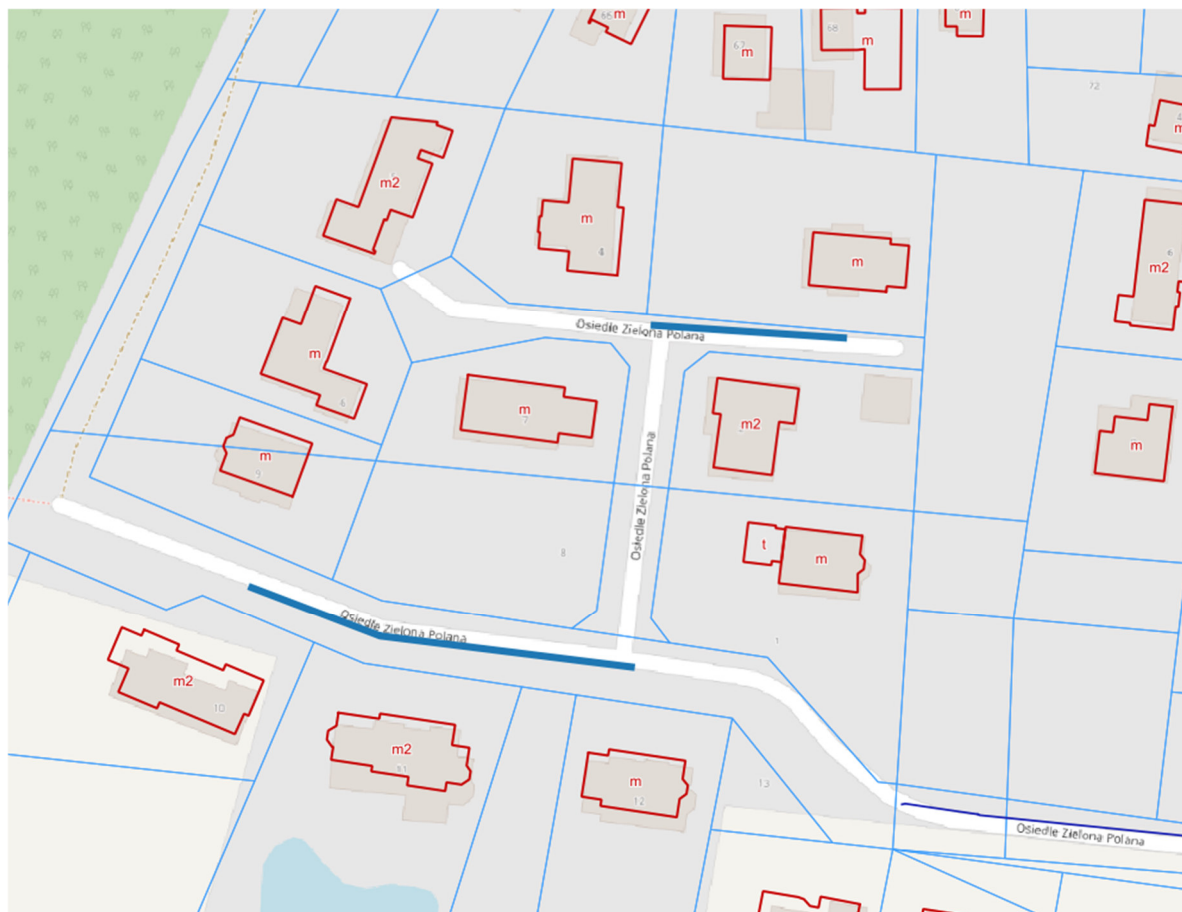

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Os. Zielona Polana:
DN100 dł. 131m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 466 tys. zł.,
w tym we WPRiM 279 tys. zł.

Grupa II.


2021 - 2026 - dokumentacja projektowa
(**etap końcowy - aktualizacja dokumentacji**)
2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
(**planowany czas realizacji RBM – 12 m-cy**)

Wspólna realizacja z zadaniami:

5-11-19-257-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna
w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu
5-11-14-095-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna
w ul. Krętej i Prostej w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 5-11-19-257-1

Kórnik - kanalizacja sanitarna w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

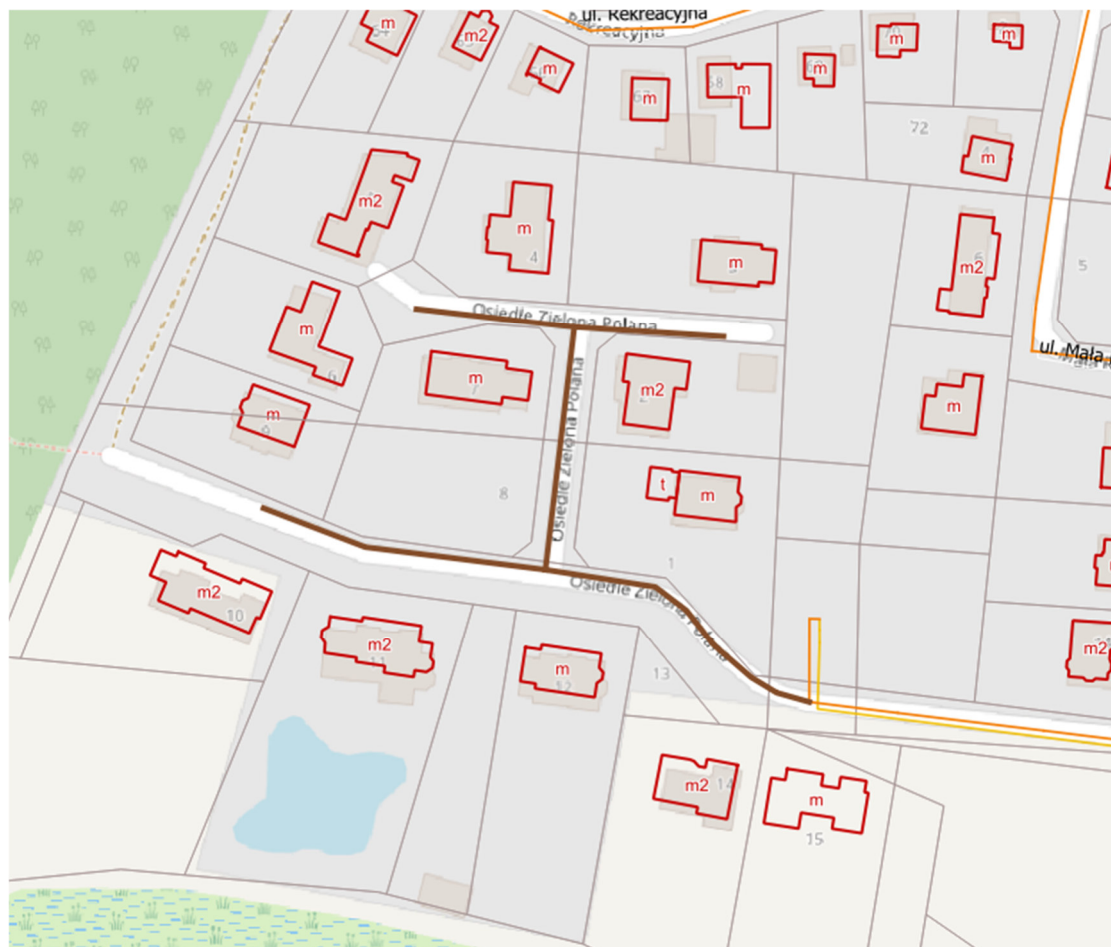

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Os. Zielona Polana:
DN250 dł. 70m, DN200 dł. 230m
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 972 tys. zł.,
w tym we WPRiM 886 tys. zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2021 - 2026 - dokumentacja projektowa
(etap końcowy - aktualizacja dokumentacji)

2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 12 m-cy)


Wspólna realizacja z zadaniami:

3-11-18-054-1 - Kórnik - sieć wodociągowa
w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu

5-11-14-095-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna
w ul. Krętej i Prostej w Borówcu

Zadanie inwestycyjne 3-11-17-177-0

Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Wspólnej w Szczytnikach

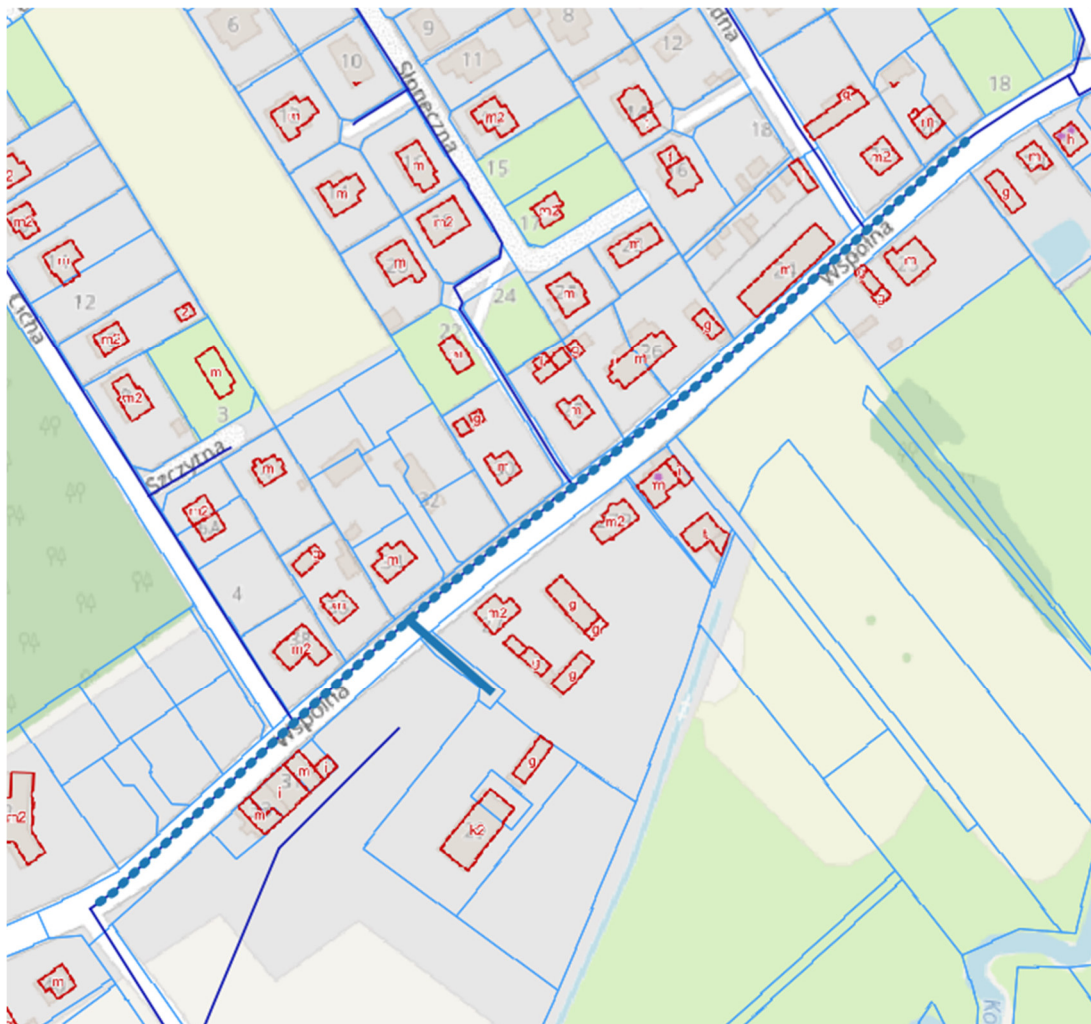

Zakres:

Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej i bocznej od ul. Wspólnej:

- DN200 dł. 425m
 - DN100 dł. 40m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 321 tys. zł.,
w tym we WPRiM 1 307 tys. zł.

Grupa I.


- 2021 - 2026 - dokumentacja projektowa
(odbiór końcowy dokumentacji – weryfikacja AQ)
- 2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 18 m-cy)

Koordinacja z budową drogi przez UMiG.

Wspólna realizacja z zadaniem:
3-11-19-283-0 Kórnik – sieć wodociągowa
w ul. Szczepińskiej w Szczytnikach

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-283-0

Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Szczególnej w Szczytnikach

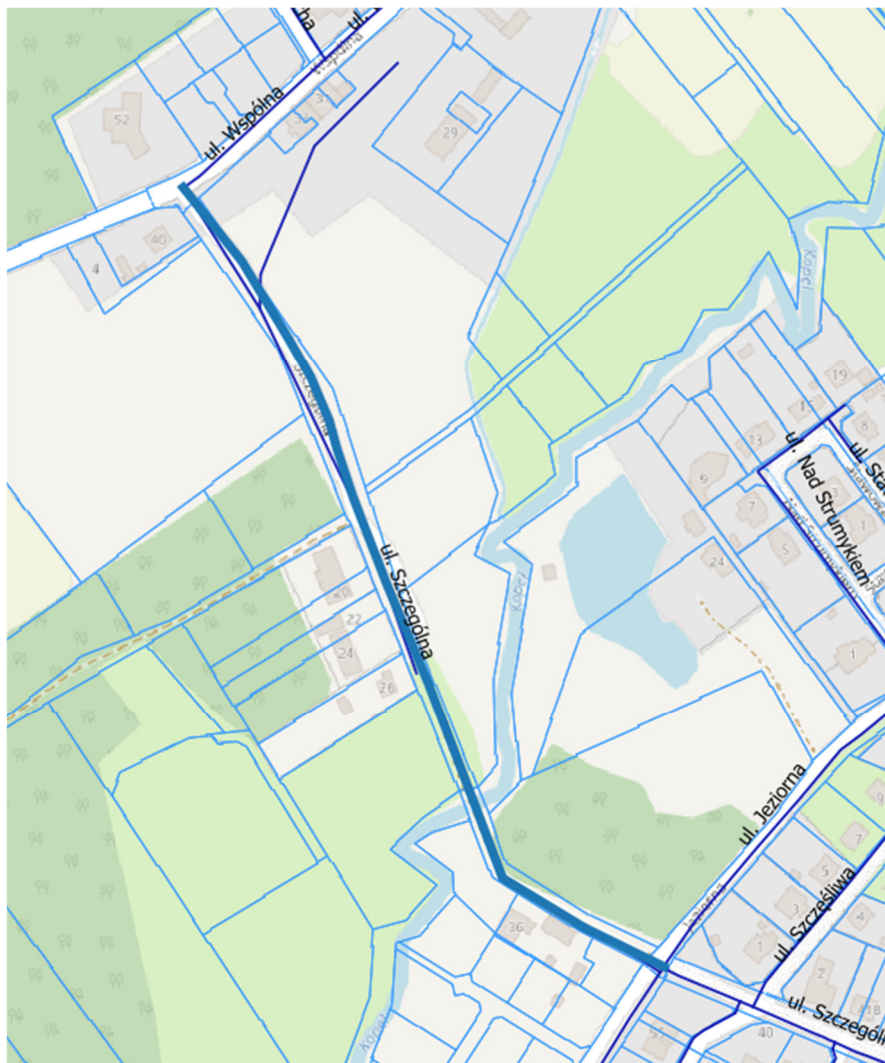

Zakres:

Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ul. Szczególnej:

- DN150 dł. 502m,
 - likwidacja istn. sieci wodociągowej
 - DN65 dł. 285m
 - DN100 dł. 40m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 062 tys. zł.,
w tym we WPRiM 1 038 tys. zł.


Grupa I.

- 2021 – 2026 - dokumentacja projektowa
(odbiór końcowy dokumentacji – weryfikacja AQ)
- 2026 – 2027 - roboty budowlano-montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 18 m-cy)

Wspólna realizacja z zadaniem:
3-11-17-177-0 Kórnik – sieć wodociągowa
w ul. Wspólnej w Szczytnikach

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-241-1

Kórnik - sieć wodociągowa na os. Międzylesie w Czołowie

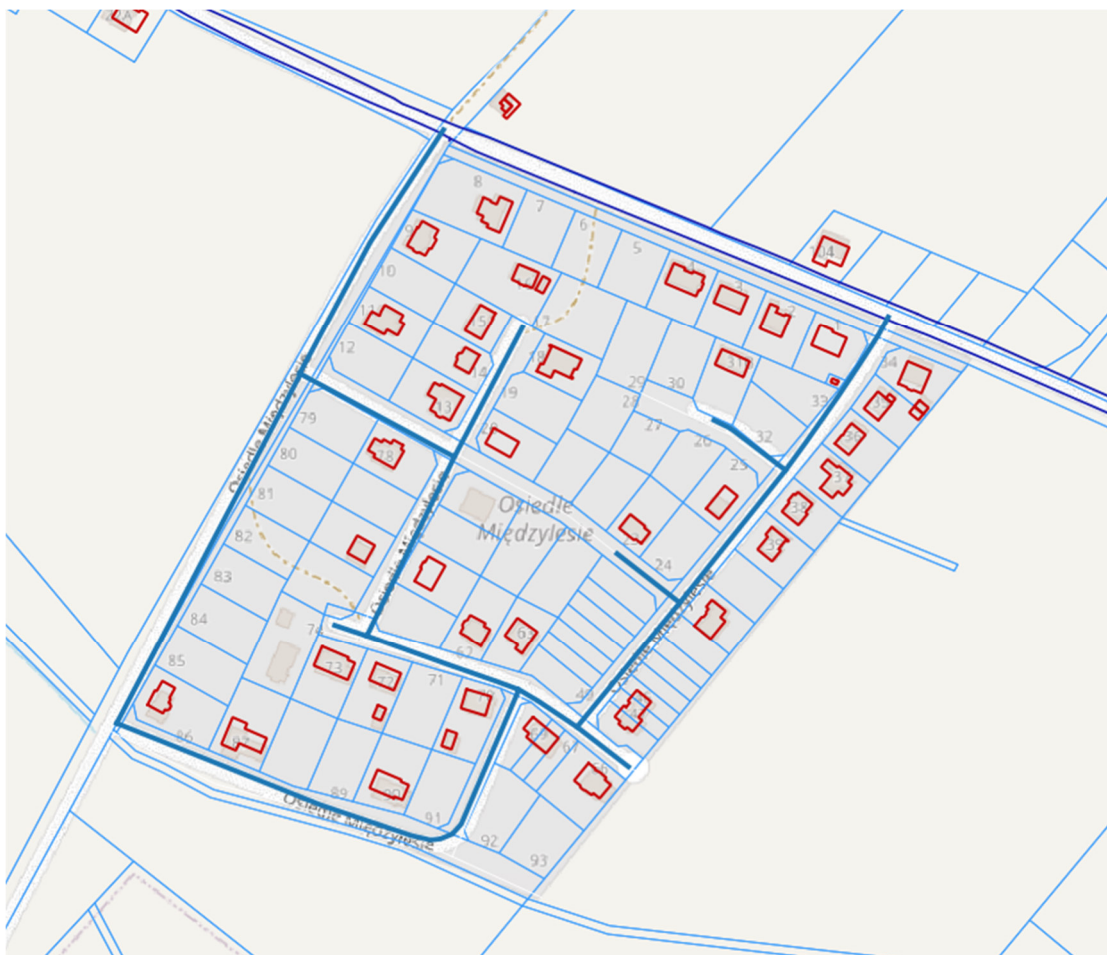

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej na os. Międzylesie:

- DN200 dł. 334m

- DN100 dł. 1167m


wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 71 tys. zł.,
w tym we WPRiM 10 tys. zł.

Grupa II.

2022 - 2026 - dokumentacja projektowa
(problemy terenowo – prawne, w trakcie procedura
z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
w celu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości)

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-320-1 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Głównej w Dzieńmierowie - etap I
 Zadanie inwestycyjne 3-11-19-321-0 Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Głównej w Dzieńmierowie - etap II

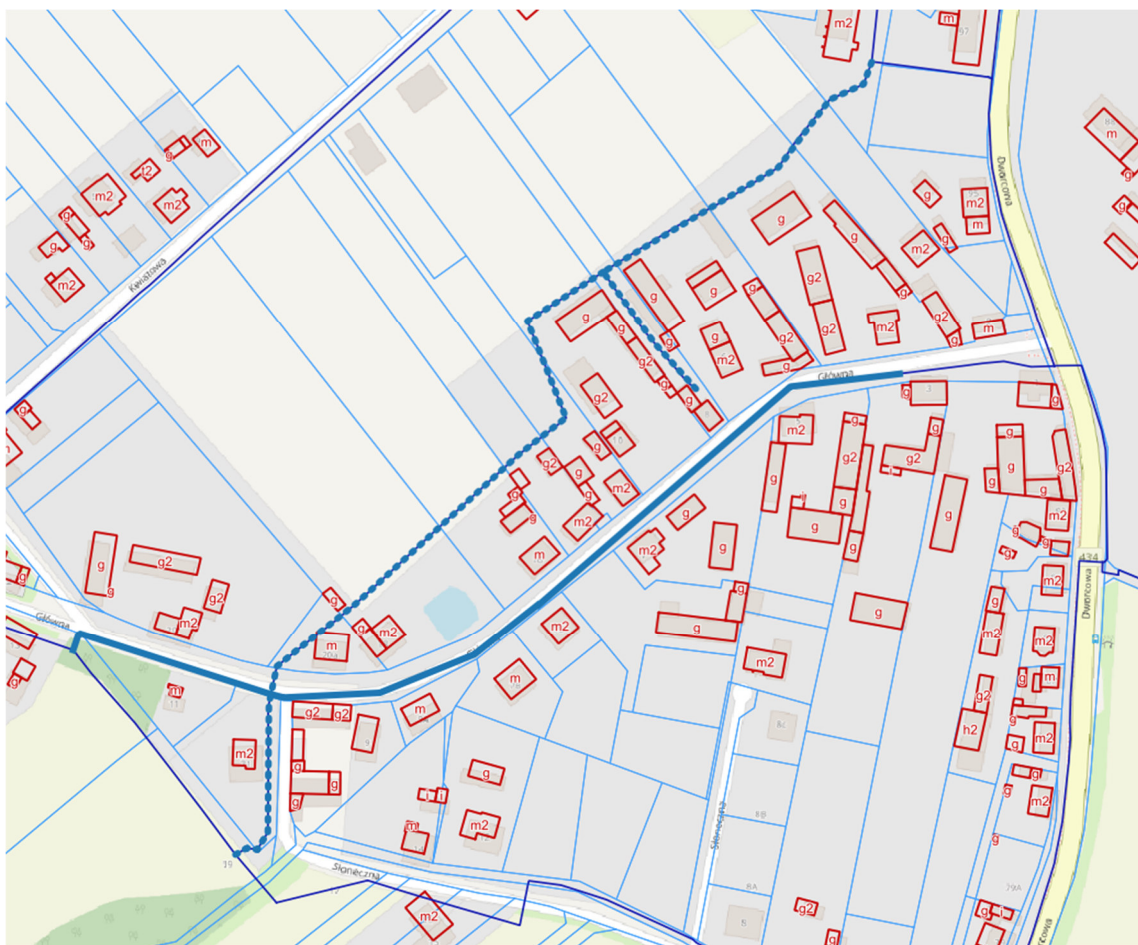


Zakres:
 (19-320) Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej: DN200 dł. 120m wraz z przyłączami
 łączne nakłady: 480 tys. zł.,
 w tym we WPRiM 464 tys. zł.
 Grupa II.

(19-321) Budowa sieci wodociągowej DN200 dł. 263m wraz z przełączeniem i wymianą przyłączy, likwidacja istn. sieci wodociągowej DN80 dł. 510m.
 łączne nakłady: 1 137 tys. zł.,
 w tym we WPRiM 1 101 tys. zł.
 Grupa I.

2022 - 2026 - dokumentacja projektowa
 (problemy terenowo – prawne, w trakcie procedura z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości)
 2027 - roboty budowlano-montażowe
 (planowany czas realizacji RBM – 12 m-cy)

Zadanie inwestycyjne 3-11-19-242-1

Kórnik - sieć wodociągowa na osiedlach: Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy

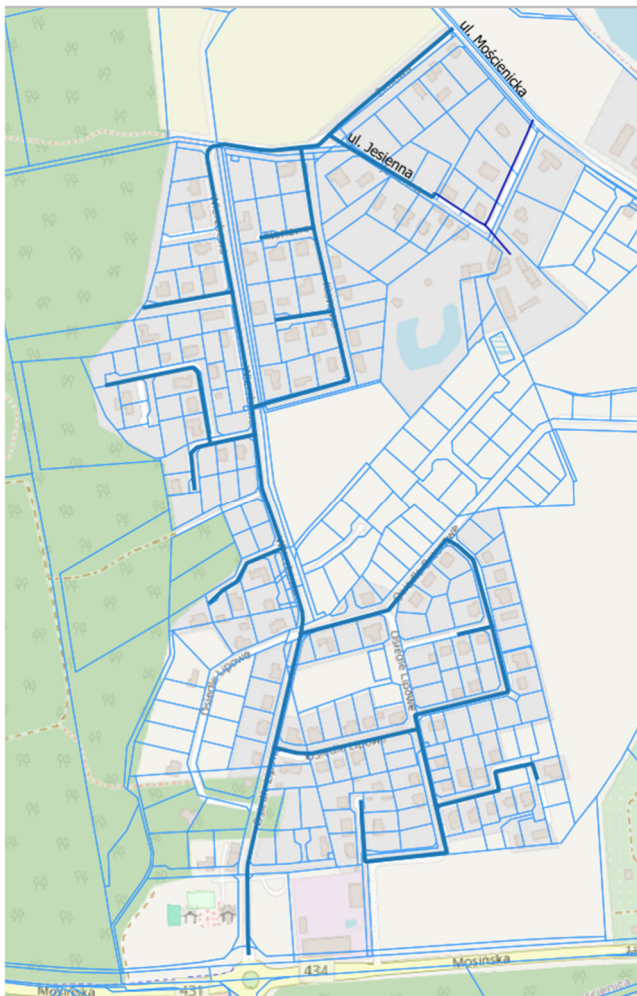

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej na osiedlach: Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze oraz w ulicach Jesienna, Klonowa, Wierzbowa i Zimowa:

- DN150 dł. 1270m,
 - DN100 dł. 3430m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 94 tys. zł.,
w tym we WPRiM 31 tys. zł.

Grupa II.

2021 - 2026 - dokumentacja projektowa
(wydłużone postępowanie o pozwolenie na budowę)

Zadanie inwestycyjne 3-11-18-096-1

Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Sportowej w Kamionkach



Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej:
DN100 dł. 135m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 286 tys. zł.,
w tym we WPRiM 266 tys. zł.

Grupa II.

2021 - 2026 - dokumentacja projektowa

(etap uzgadniania dokumentacji)

2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe

(planowany czas realizacji RBM – 6 m-cy)


Wspólna realizacja z zadaniami:

5-11-16-097-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna
w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach

5-11-19-229-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna
w ul. Piaskowej w Kamionkach

Zadanie inwestycyjne 5-11-16-097-1

Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach

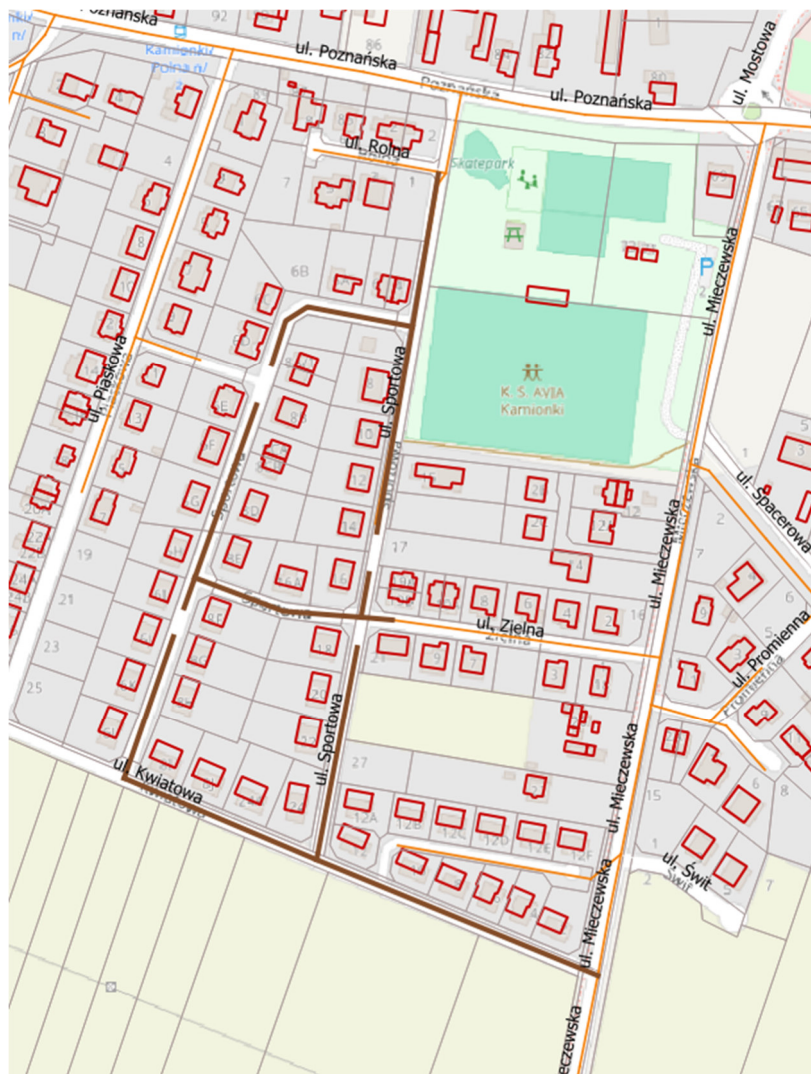

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i Kwiatowej :

- DN250 dł. 260m
 - DN200 dł. 545m
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 284 tys. zł.,
w tym we WPRiM 2 257 tys. zł.

Grupa I. Dofinansowania - FS7.

2021 - 2026 - dokumentacja projektowa
(etap uzgadniania dokumentacji)


2026 - 2027 - roboty budowlano-montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 6 m-cy)

Wspólna realizacja z zadaniami:

3-11-18-096-1 - Kórnik – sieć wodociągowa
w ul. Sportowej w Kamionkach

5-11-19-229-1 - Kórnik – kanalizacja sanitarna
w ul. Piaskowej w Kamionkach

Zadanie inwestycyjne 5-11-17-185-1 Kórnik – kanalizacja sanitarna na os. Azaliowym w Kamionkach

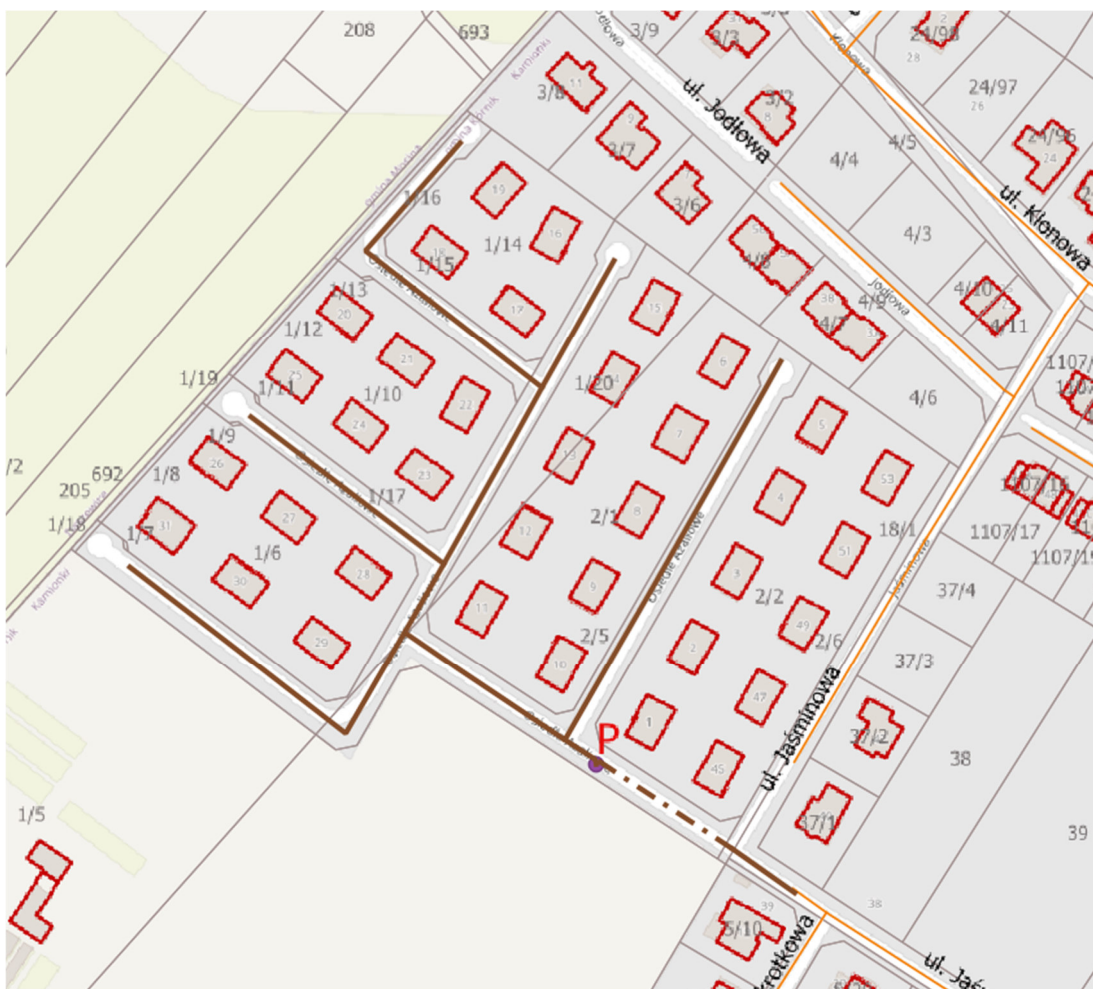

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Azaliowym:

- kanał grawitacyjny DN200 dł. 674m
 - rurociąg tłoczny DN100 dł. 37m
 - przepompownia - 1 szt.
- wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 992 tys. zł.,
w tym we WPRiM 2 992 tys. zł.

Grupa I.

2023 - 2026 - dokumentacja projektowa
(problemy terenowo - prawne związane z upadłością dewelopera, trwają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane)
2027 - 2029 - roboty budowlano – montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 16 m-cy)

Zadanie inwestycyjne 5-11-14-121-1 Kórnik - kanalizacja sanitarne dla m. Błazejewo



Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej:

- kanały grawitacyjne DN200 dł. 428m, DN250 dł. 2637m,
- przepompownie ścieków,
- rurociągi tłoczne dł. 1087m
- sieci wodociągowe DN100 dł. 460m
wraz z przyłączami.

Przebudowa:

- przepompowni wraz z ruroc. tłocznym DN160 dł. 233m,
- kanalizacji sanitarnej DN250 dł. 141m.

Łączne nakłady: 11 608 tys. zł.,
w tym we WPRiM 10 833 tys. zł.

Grupa I. Dofinansowania – FS7.

2019 - 2026 - dokumentacja projektowa

(wydłużone postępowanie o pozwolenie na budowę)

2026 - 2031 - roboty budowlano-montażowe

(planowany czas realizacji RBM – 30 m-cy)

Zadanie inwestycyjne 5-11-18-064-0

Kórnik - przebudowa istniejącego systemu podciśnieniowego na system ciśnieniowy w Kórniku i Bninie



Zakres:

Przebudowa istn. systemu kanalizacji sanitarnej w Kórniku i Bninie zgodnie z koncepcją:

- likwidacja studni zaworowych - 7 szt.
- budowa i przebudowa przepompowni ścieków - 9 szt.
- przełączenie istn. sieci do proj. przepompowni

Łączne nakłady: 5 245 tys. zł.,
w tym we WPRiM 5 245 tys. zł.

Grupa I.

2023 - 2024 - koncepcja


2025 - 2026 - dokumentacja projektowa

2027 - 2029 - roboty budowlano – montażowe
(planowany czas realizacji RBM – 14 m-cy)

7. Zadania w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową

Zadanie inwestycyjne 5-11-18-005-1

Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 20 Października

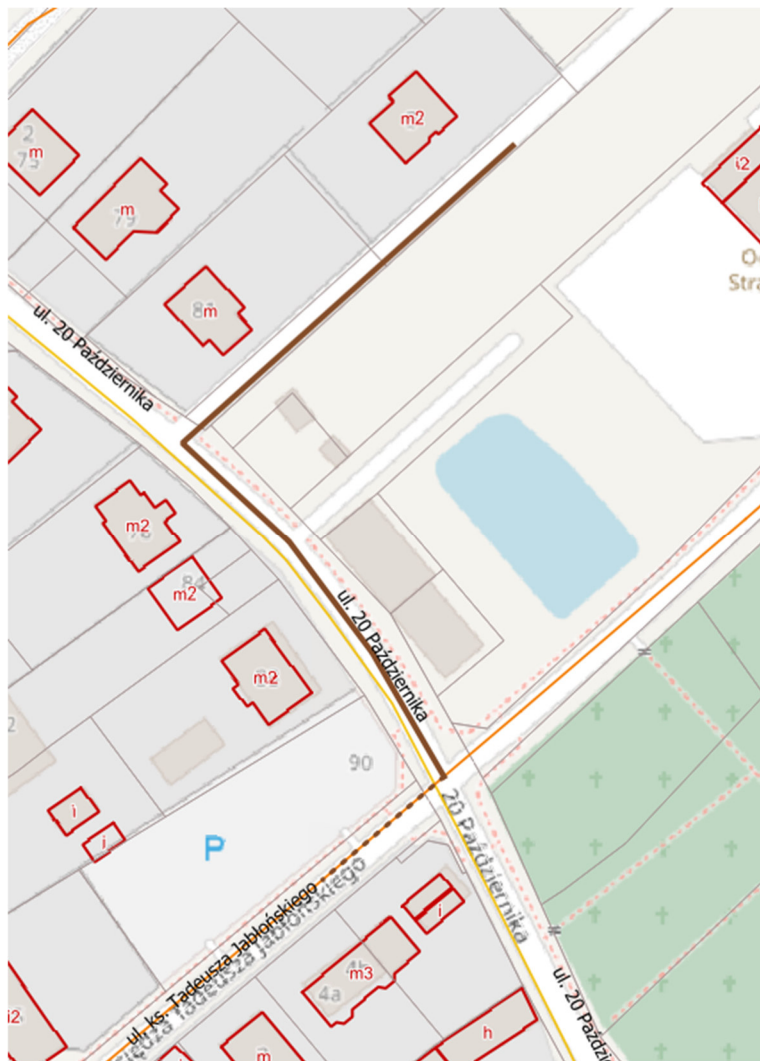

Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Października i Weymana:
DN200 dł. 182m wraz z przyłączami.
Przebudowa istn. kanału DN200 dł. 30m.

Łączne nakłady: 506 tys. zł.,
w tym we WPRiM 496 tys. zł.


Grupa I.

2021 - 2027 - dokumentacja projektowa
(rozwiązana poprzednia umowa z biurem projektów,
planowane ogłoszenie przetargu - II kwartał 2026 r.)
2028 - 2029 - roboty budowlano-montażowe

Wspólna realizacja z zadaniami:

- 3-11-17-173-0 - Kórnik - sieć wodociągowa
w ul. Szarych Szeregów
- 3-11-17-007-1 - Kórnik - sieć wodociągowa
w rejonie ul. 20 Października
- 3-11-25-093-0 - Kórnik - sieć wodociągowa
w ul. Dworcowej

Zadanie inwestycyjne 3-11-25-093-0 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Dworcowej

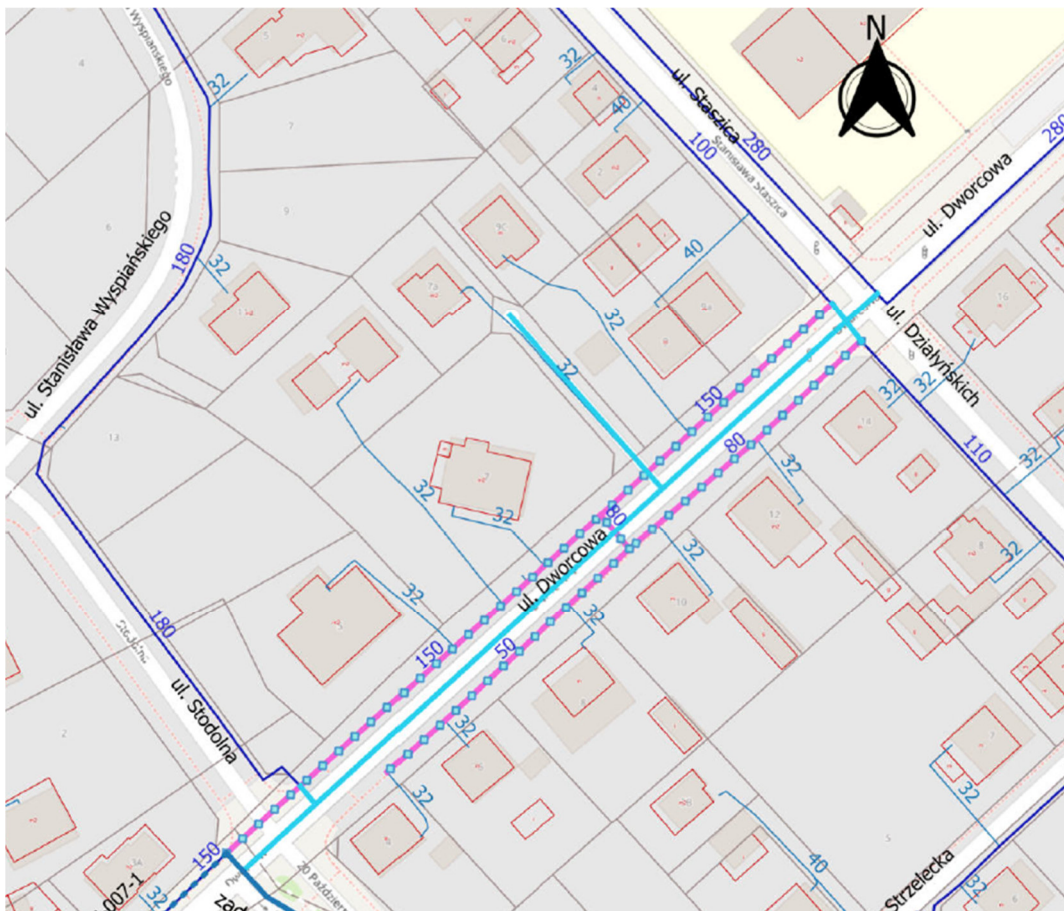

Zakres:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej: DN150 dł. 165m, DN100 dł. 55m wraz z przyłączami.

Likwidacja istn. sieci wodociągowej: DN150 dł. 151m, DN80 dł. 66m, DN50 dł. 61m.

Łączne nakłady: 656 tys. zł.,
w tym we WPRiM 656 tys. zł.

Grupa I.

2026 - 2027 - dokumentacja projektowa
(planowane ogłoszenie przetargu - II kwartał 2026 r.)
2028 - roboty budowlano-montażowe

Wspólna realizacja z zadaniami:

- 3-11-17-173-0 - Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Szarych Szeregów
- 3-11-17-007-1 - Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. 20 Października
- 5-11-18-005-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 20 Października

8. Zestawienie zadań, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej

L.p.	Numer zadania	Nazwa zadania	Grupa	Terminy realizacji dokumentacji	Całkowite nakłady wg WPRiM 2026-2029 [zł]	Uwarunkowania
ZADANIA WODOCIĄGOWE						
1	3-11-21-027-1	Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Poprzecznej, Pogodnej i Bocznej w Szczytnikach	druga	2027 - 2028	78 000	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców.
2	3-11-25-090-0	Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Jesiennej w Mościenicy	pierwsza	2026 - 2027	508 000	Przebudowa sieci z terenów prywatnych w pas drogowy.
3	3-11-25-196-0	Kórnik - sieć wodociągowa w Kórniku i Bninie - etap I	pierwsza	2027 - 2029	205 000	Wzmocnienie i uporządkowanie systemu sieci wodociągowej w obszarze zadania 5-11-25-109-0
ZADANIA KANALIZACYJNE						
1	5-11-14-097-1	Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Źródlanej w Borówcu	pierwsza	2026 - 2028	1 450 653	Rozwiązana umowa z poprzednim projektantem w związku z procedurą z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Ponowne skierowanie zadania do projektowania.
2	5-11-25-109-0	Kórnik - przebudowa systemu podciśnieniowego na system ciśnieniowy w Kórniku i Bninie - etap 1	pierwsza	2027 - 2029	520 000	Problemy eksploatacyjne na istniejącym systemie podciśnieniowym. Zwiększenie możliwości odbioru ścieków. Przebudowa z terenów prywatnych w pas drogowy.

9. Zadania, dla których planowane jest zlecenie Koncepcji

L.p.	Numer zadania	Nazwa zadania	Grupa	Terminy realizacji koncepcji	Całkowite nakłady wg WPRiM 2026-2029 [zł]	Uwarunkowania
ZADANIA KANALIZACYJNE						
1	7-05-07-011-1	Koncepcje programowo - przestrzenne	pierwsza	2026-2028	700 000	Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki ściekami sanitarnymi dla gm. Kórnik
2	5-11-15-147-1	Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Szczytniki	druga	2026-2028	250 000	Koncepcja programowo - przestrzenna budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki i Koninko
3	5-11-17-169-1	Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. Koninko	druga	2026-2028	250 000	

- wykonanie ww. koncepcji realizowane będzie w ramach jednego zamówienia
- w trakcie przygotowanie postępowania przetargowego

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
